



Finanšu ministrija

### **Informatīvais ziņojums par**

**Finanšu ministrijas pārziņā esošo Eiropas Savienības fondu un ārvalstu finanšu palīdzības aktualitātēm līdz 2022. gada 1. septembrim (pusgada ziņojums)**



**Finansē  
Eiropas Savienība**



**Satura rādītājs**

1.	Kopsavilkums .....	6
2.	2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana .....	10
2.1.	Investīciju aktualitātes un prognozes .....	10
2.2.	Investīciju risku pārvaldība .....	12
2.3.	Vadības un kontroles sistēmas darbība .....	19
3.	ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periods .....	22
4.	Atveseļošanas fonda plāna ieviešana .....	24
5.	EEZ/Norvēģijas grantu investīciju progress .....	28
6.	Secinājumi un priekšlikumi .....	31

**PIELIKUMS:**

ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda MK noteikumu par investīciju ieviešanu izstrādes indikatīvais laika grafiks.

## Saīsinājumi

Atveseļošanas fonds vai AF	Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānisms
CARE	EK iniciatīva <i>Cohesion's Action for Refugees in Europe</i> , kas mērķēta uz potenciālu ERAF, ESF un Eiropas atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām atbalstu ES dalībvalstīm 2014.–2020. gada plānošanas periodā jau pieejamā ES fondu finansējuma ietvaros (neparedzot papildu finansējumu).
CFLA	Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (ES fondu sadarbības iestāde)
DP	ES 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programma “Izaugsme un nodarbinātība”
DSF	Divpusējās sadarbības fonds
EAFVP	Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām
EK	Eiropas Komisija
EM	Ekonomikas ministrija
ERAF	Eiropas Reģionālās attīstības fonds
ES	Eiropas Savienība
ESF	Eiropas Sociālais fonds
ES fondi	ESF, ERAF un KF, 2021.–2027. gadu periodā – ERAF, KF, ESF+, TPF
EEZ/Norvēģijas granti	Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu 2014.–2021. gada periods
ESF+	Eiropas Sociālais fonds Plus
FM	Finanšu ministrija
IUB	Iepirkumu uzraudzības birojs
IKP	Iekšzemes kopprodukts
KF	Kohēzijas fonds
KP VIS	Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma
KP VIS AF	Kohēzijas politikas vadības informācijas sistēma, pielāgota AF vajadzībām
IZM	Izglītības un zinātnes ministrija
LM	Labklājības ministrija
MK	Ministru kabinets
AF MKN	MK 2021. gada 7. septembra noteikumi Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība”
NVI	Neatbilstoši veiktie izdevumi
PSKUS	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca”
Regula Nr. 1303/2013	Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF, Eiropas

	Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par ERAF, ESF, KF un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1083/2006
Regula Nr. 2021/1060	Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 24. jūnija regula (ES) Nr. 2021/1060, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai ( <i>attiecās uz ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodu</i> )
RePowerEU	EK iniciatīva AF papildu piešķīrumam enerģētikas jomai
RI	Revīzijas iestāde
SAM	Specifiskais atbalsta mērķis
SM	Satiksmes ministrija
TAP	Vienotais tiesību aktu portāls
TPF	Taisnīgas pārkārtošanās fonds
VARAM	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
VI	Vadošā iestāde
VM	Veselības ministrija

### Skaidrojumi:

*Ziņojumā ir konspektīva informācija par Kohēzijas politikas ES fondu, AF plāna, EEZ/Norvēģijas grantu investīciju ieviešanas aktualitātēm Latvijā 2022. gada pirmajā pusgadā un operatīvā informācija līdz 2022. gada augustam, kas sagatavota saskaņā ar:*

- 1) MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34. § 11. punktā uzdoto finanšu ministram divas reizes gadā (līdz 1. aprīlim un 1. oktobrim) iesniegt MK ziņojumus par FM pārziņā esošo ES fondu un ārvalstu finanšu palīdzības (ES fondu, Atveseļošanas fonda, EEZ /Norvēģijas un Latvijas un Šveices sadarbības programmas investīciju progresu (pusgada ziņojums).*
- 2) MK noteikumu Nr. 621 18. punktu par pusgada ziņojumu sniegšanu par Atveseļošanas fonda plāna īstenošanas progresu.*
- 3) MK 2015. gada 10. marta sēdes protokola Nr. 14 27. § 11. punktā uzdoto sniegt MK ikmēneša operatīvo informāciju par ES fondu investīcijām.*

Plašākā informācija par šajā ziņojumā minētajām tēmām ir pieejama arī **ES fondu tīmekļa vietnē** <https://www.esfondi.lv/sakums>, piem.

- ES fondu investīciju prognozes un progress: sadaļā ES fondi 2014–2020 → Ieviešana.
- AF investīcijas: sadaļā Atveseļošanas un noturības mehānisms.
- Ziņojumi, pārskati, dažādas publikācijas un prezentācijas: [1] ziņojumi MK: sadaļa Materiāli un ziņojumi → ES fondu ziņojumi Ministru kabinetam un Saeimas komisijām: <https://www.esfondi.lv/zinojumi-Ministru-kabinetam>; [2] ziņojumi EK: sadaļa Materiāli un ziņojumi → ES fondu ziņojumi 2014–2020 → Gadskārtējie un stratēģiskie ziņojumi Eiropas Komisijai: <https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi>;
- ES fondu izvērtēšanas jautājumi 2014.–2020. gada plānošanas periodā: sadaļā Par ES fondiem → Izvērtēšana: <https://www.esfondi.lv/es-fondu-izvertesana-1>.

Aktuālā projektu ieviešanas informācija pieejama CFLA tīmekļa vietnē, t. sk. specifiski par iesniegumu atlasēm sadaļā ES fondi 2014 – 2020 → projektu iesniegumu atlases: <https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases> un atbalsts ieviešanā – Palīgs finansējuma saņēmējiem » CFLA.

Ziņojumā izmantoti KP VIS pieejamie dati; SAM un SAM pasākumu saīsinātie nosaukumi, pilnie nosaukumi ir ES fondu tīmekļa vietnē: sadaļa ES fondi 2014–2020 → Plānošana → Plānošanas dokumenti (tabulas 12. ieraksts): <http://www.esfondi.lv/planosanas-dokumenti>.

VARAM analītiskais ziņojums par ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda ieguldījumiem un uzraudzības rādītājiem Latvijas administratīvajās teritorijās: Reģionālās attīstības indikatoru modulis <http://raim.gov.lv>: “Tematiskā analīze” → “Par ES fondu (2014.-2020.) ieguldījumiem” jeb <https://raim.gov.lv/node/49>.

Plašāka informācija par EEZ/Norvēģijas grantiem ir pieejama portālā: <https://eeagrants.lv/par-grantiem/par-grantiem/>.

## 1. Kopsavilkums

No **2014.–2020. gada** plānošanas perioda sākuma līdz 2022. gada 30. jūnijam **projektu līgumiem** jau piesaistīti **4,4 mljrd. euro**, **94 %** no pieejamā **4,64 mljrd. euro** ES finansējuma<sup>1</sup>.

Valsts budžeta ieņēmumos **no EK ir saņemti 2,7 mljrd. euro** kā ES fondu līdzfinansējuma atmaksas, t. sk. 2022. gadā līdz 30. jūnijam – 234 milj. euro<sup>2</sup>. Ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas izraisītos riskus, sekas un ietekmi uz investīciju ieviešanas gaitu, īstenotāji un ES fondu vadībā iesaistītās un citas kompetentās iestādes rīkojas esošā regulējuma un iespēju robežās, lai pabeigtu uzsāktos projektus un Latvija spētu no EK saņemt visu ES fondu “piešķirumu” šajā plānošanas periodā.

**ES fondu 2021.–2027. gada** plānošanas perioda uzsākšanai 2022. gada pirmajā pusē **apstiprināšanai EK iesniegts Partnerības līgums** un precizētā **Programma, stājies spēkā vadības likums**, aktīvi notiek pakārtoto horizontālo normatīvo aktu un konkrētu investīciju nosacījumu izstrāde un apstiprināšana.

**Atveseļošanas fonda** plāna ar **1,82 mljrd. euro** ES investīcijām Latvijā ietvaros 2022. gada jūnijā EK **iesniegts pirmais maksājuma pieprasījums** par sasniegtajiem deviņiem 2021. gada reformu -un investīciju atskaites punktiem, par ko **2022. gada 29. jūlijā EK apstiprināja pozitīvu sākotnējo novērtējumu**. Pozitīva EK galējā novērtējuma gadījumā **sagaidāmais EK maksājums Latvijai** valsts budžeta ieņēmumos ir **201 milj. euro**. Atbildīgās iestādes strādā pie normatīvā regulējuma izstrādes, t. sk. 2022. gadam noteikto atskaites punktu sasniegšanas. FM gatavo priekšlikumus AF plāna grozījumiem AF finansējuma mainīgās daļas, aizdevuma un RePowerEU finansējuma piesaistei papildu reformām un investīcijām.

Ārvalstu finanšu palīdzības ietvaros **EEZ/Norvēģijas grantos** ir notikuši gandrīz visi projektu konkursi un **īstenošanā** ir projekti un divpusējās sadarbības pasākumi par **83,2 milj. euro** – **97 %** no 85,4 milj. euro pieejamā donoru atbalsta finansējuma. Saskaņā ar 2022. gada 10. maijā MK lemto EEZ/Norvēģijas finansējumu indikatīvi 387 tūkst. euro plānots izmantot ukraiņu bēgļu atbalstam Latvijā – fonds “Ziedot.lv” sniegs palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā 150 tūkst. euro apmērā un par indikatīvi 237 tūkst. euro tiek izskatītas citas iniciatīvas ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai. Papildus procesā ir jaunas Latvijas un Šveices sadarbības programmas iespēju izmantošanas virzība<sup>3</sup>.


<sup>1</sup> Latvijas IKP 2021. gadā ir audzis par 4,5%, no kura ES fondu investīciju devums ir 1,3 procentpunkti jeb līdzvērtīgs 2020. gada devumam Saskaņā ar 2022. gada marta aktualizēto makroekonomikas scenāriju, ka izveidots augstas ģeopolitiskas nenoteiktības apstākļos, Latvijas Stabilitātes programmai 2022.–2025. gadam, Latvijas ekonomikas izaugsme 2022. gadā sasnies 2,1%, t. sk., ES fondu investīciju devums ir 1 procentpunkts. Ekonomikas attīstības scenārijs tiks pārskatīts, izstrādājot makroekonomikas rādītāju prognozēs vispārējās valdības budžetam vidējā termiņā š. g. augustā. Plašāka informācija FM ikmēneša makroekonomikas un kopbudžeta apskatos: [https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas\\_analize/tautsaimniecibas\\_analize/ikmenses\\_makroekonomikas\\_un\\_kopbudzeta\\_apskats/](https://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/tautsaimniecibas_analize/tautsaimniecibas_analize/ikmenses_makroekonomikas_un_kopbudzeta_apskats/). Aktuālākais: [download \(fm.gov.lv\)](https://www.fm.gov.lv/).

<sup>2</sup> Neieskaitot avansa maksājumus.


<sup>3</sup> Iespējamais Šveices atbalsts 40,4 milj. franku (CHF) investīcijām Latvijā; ieviešana līdz 2029. gada 3. decembrim Plašāka informācija skatāma TAP (projekta ID 22-TA-2132 14.07.2022. Informatīvais ziņojums par Latvijas-Šveices sadarbības programmas otrā perioda uzsākšanu un tematisko jomu, finansējuma sadalījuma apstiprināšanu.): [https://tapportals.mk.gov.lv/legal\\_acts/26add3bc-ea2d-466f-9553-911bc84ec717](https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/26add3bc-ea2d-466f-9553-911bc84ec717).

Skatīt ilustratīvus kopsavilkumus par sasniegto ar ES fondu (attēls Nr. 1), AF (attēls Nr. 2) un EEZ/Norvēģijas grantu (attēls Nr. 3) investīcijām Latvijā.


Attēls Nr. 1 "ES fondu kopsavilkums līdz 2022. gada jūlijam"

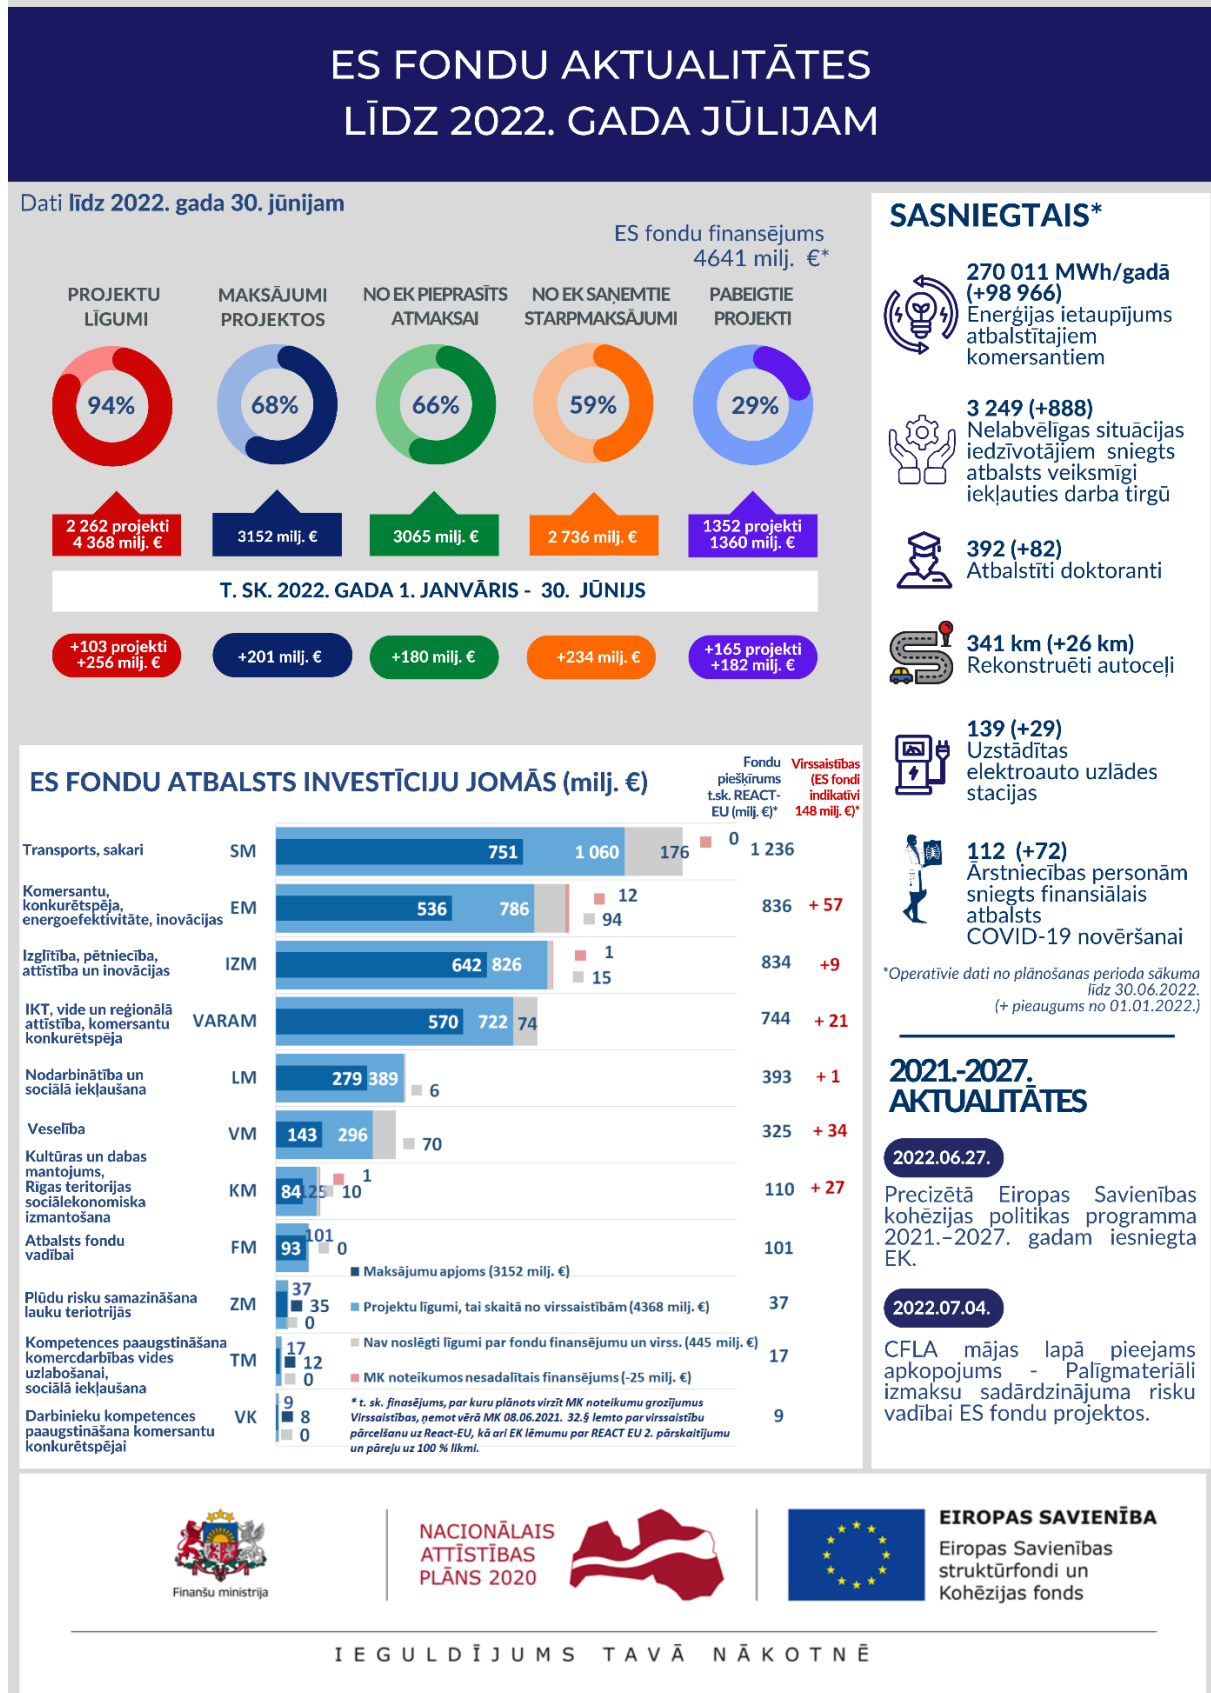

## Attēls Nr. 2 “Atvēršanas fonda aktualitātes”

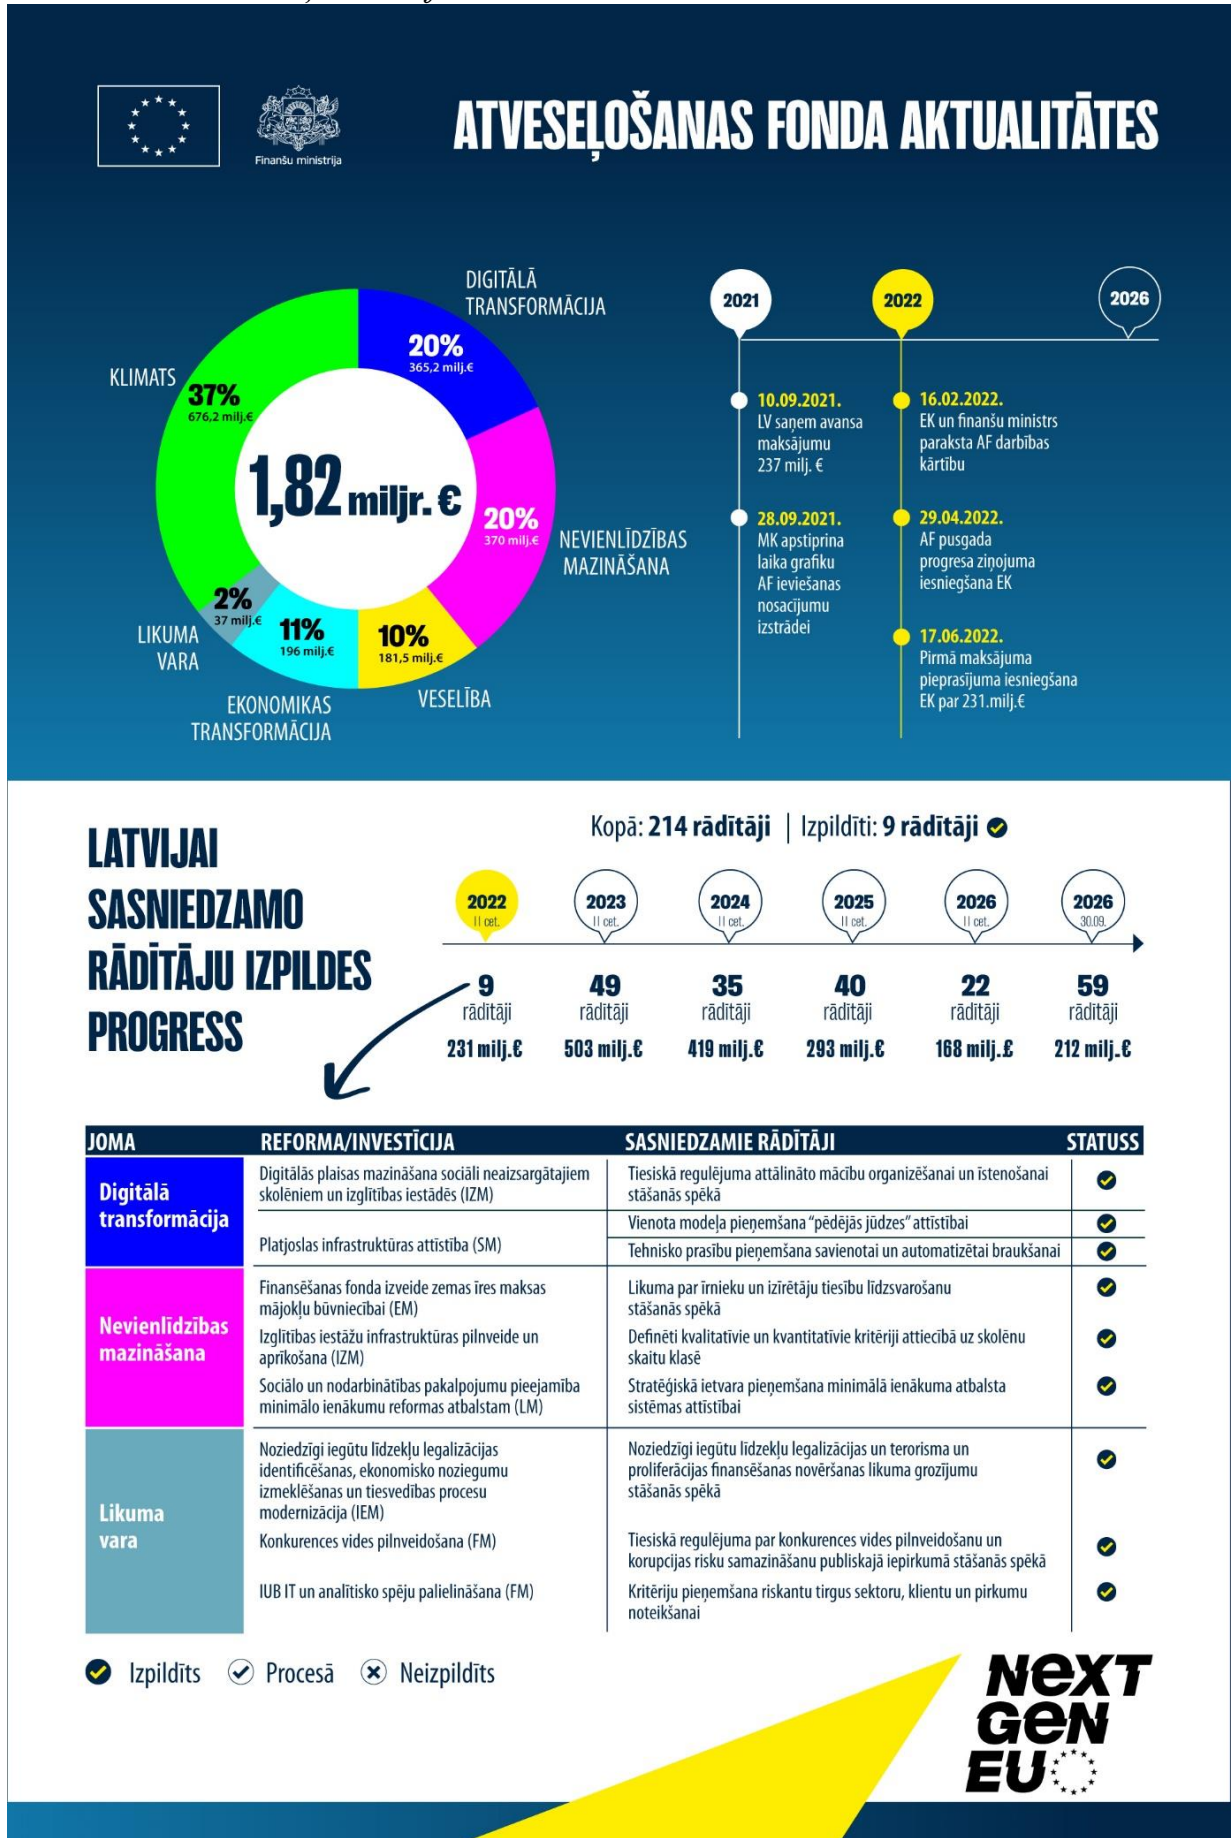

# Attēls Nr. 3 "EEZ/Norvēģijas grantu investīciju kopsavilkums līdz 2022. gada augustam"

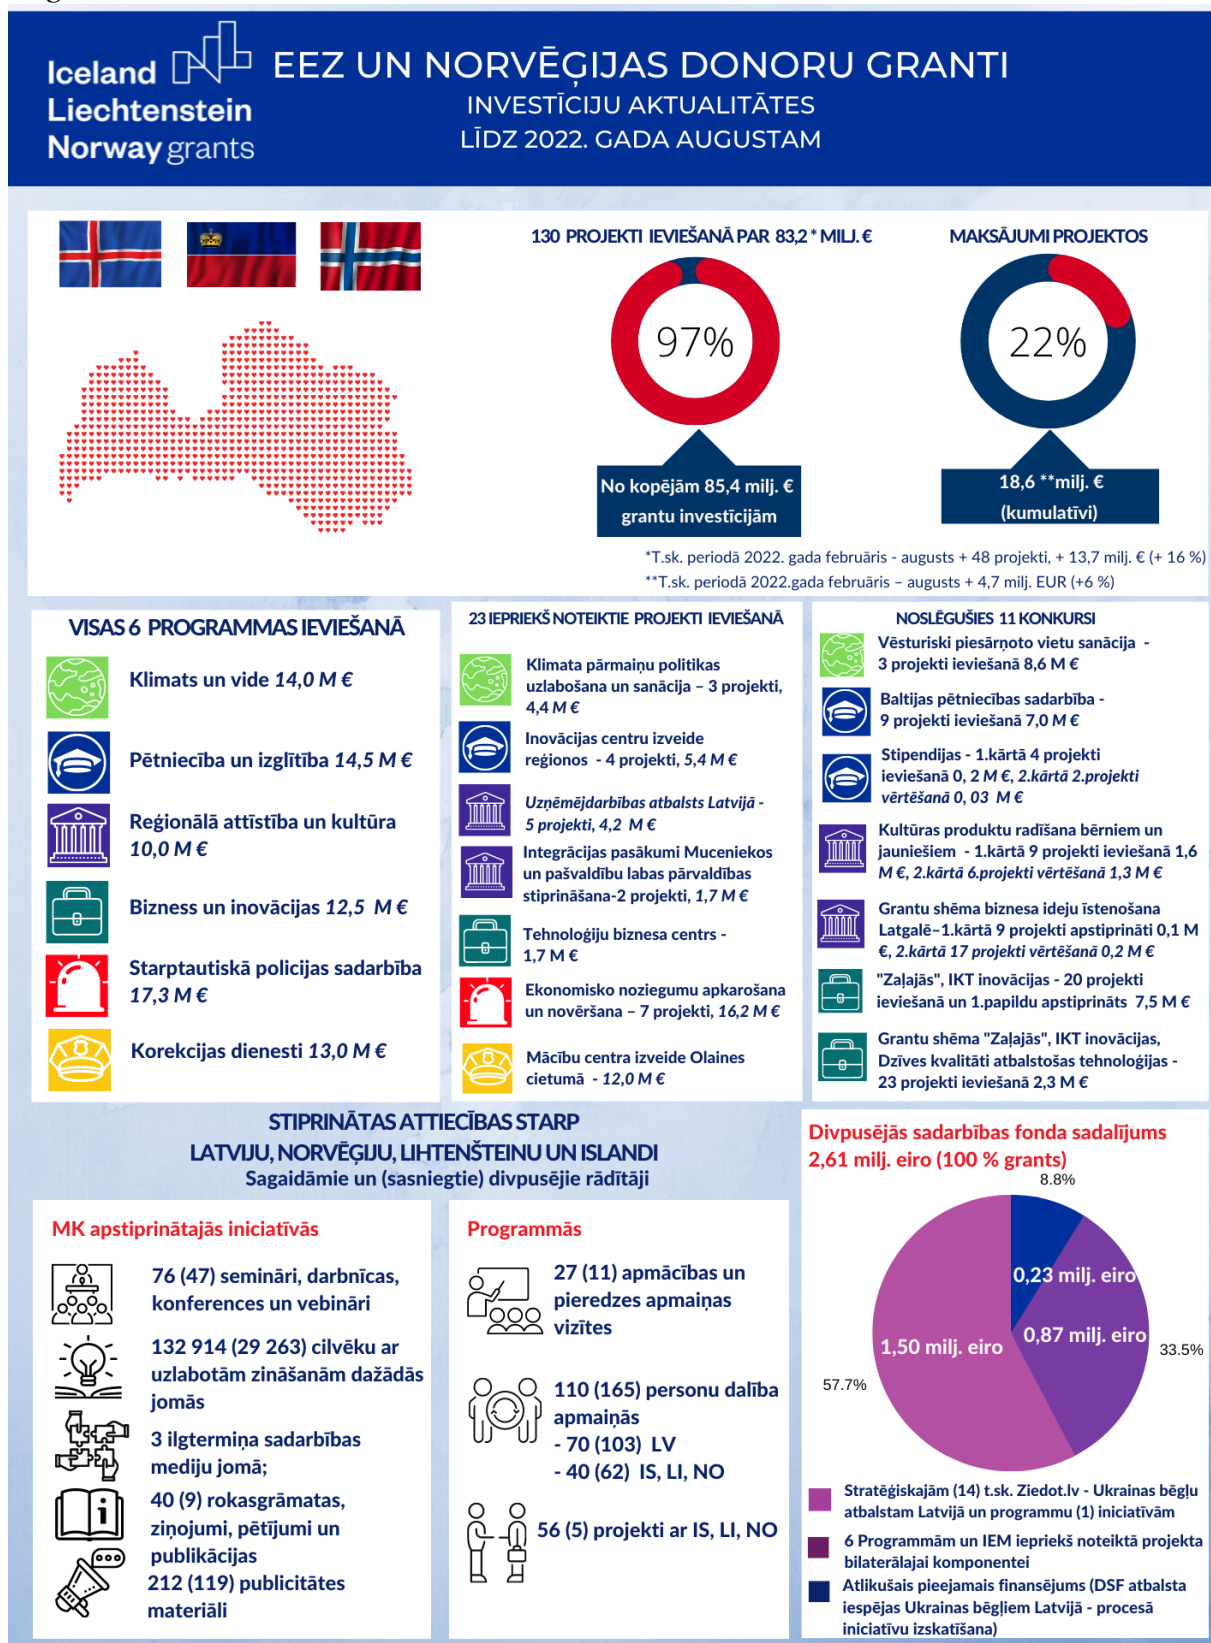

### VISAS 6 PROGRAMMAS IEVIEŠANĀ

-  **Klimats un vide 14,0 M €**
-  **Pētniecība un izglītība 14,5 M €**
-  **Reģionālā attīstība un kultūra 10,0 M €**
-  **Bizness un inovācijas 12,5 M €**
-  **Starptautiskā policijas sadarbība 17,3 M €**
-  **Korekcijas dienesti 13,0 M €**

### 23 IEPRIEKŠ NOTEIKTIE PROJEKTI IEVIEŠANĀ

-  Klimata pārmaiņu politikas uzlabošana un sanācija - 3 projekti, 4,4 M €
-  Inovācijas centru izveide reģionos - 4 projekti, 5,4 M €
-  Uzņēmējdarbības atbalsts Latvijā - 5 projekti, 4,2 M €
-  Integrācijas pasākumi Muceniekos un pašvaldību labas pārvaldības stiprināšana-2 projekti, 1,7 M €
-  Tehnoloģiju biznesa centrs - 1,7 M €
-  Ekonomisko noziegumu apkarošana un novēršana - 7 projekti, 16,2 M €
-  Mācību centra izveide Olaines cietumā - 12,0 M €

### NOSLĒGUŠIES 11 KONKURSI

-  Vēsturiski piesārņoto vietu sanācija - 3 projekti ieviešanā 8,6 M €
-  Baltijas pētniecības sadarbība - 9 projekti ieviešanā 7,0 M €
-  Stipendijas - 1.kārtā 4 projekti ieviešanā 0, 2 M €, 2.kārtā 2.projekti vērtēšanā 0, 03 M €
-  Kultūras produktu radīšana bērniem un jauniešiem - 1.kārtā 9 projekti ieviešanā 1,6 M €, 2.kārtā 6.projekti vērtēšanā 1,3 M €
-  Grantu shēma biznesa ideju īstenošana Latgalē-1.kārtā 9 projekti apstiprināti 0,1 M €, 2.kārtā 17 projekti vērtēšanā 0,2 M €
-  "Zaļajās", IKT inovācijas - 20 projekti ieviešanā un 1.papildu apstiprināts 7,5 M €
-  Grantu shēma "Zaļajās", IKT inovācijas, Dzīves kvalitāti atbalstošas tehnoloģijas - 23 projekti ieviešanā 2,3 M €

### STIPRINĀTAS ATTIECĪBAS STARP LATVIJU, NORVĒGIJU, LIHTENŠTEINU UN ISLANDI

Sagaidāmie un (sasniegtie) divpusējie rādītāji

#### MK apstiprinātajās iniciatīvās

-  76 (47) semināri, darbnīcas, konferences un vebināri
-  132 914 (29 263) cilvēku ar uzlabotām zināšanām dažādās jomās
-  3 ilgtermiņa sadarbības mediju jomā;
-  40 (9) rokasgrāmatas, ziņojumi, pētījumi un publikācijas
-  212 (119) publicitātes materiāli

#### Programmās

-  27 (11) apmācības un pieredzes apmaiņas vizītes
-  110 (165) personu dalība apmaiņās  
- 70 (103) LV  
- 40 (62) IS, LI, NO
-  56 (5) projekti ar IS, LI, NO

### Divpusējās sadarbības fonda sadalījums 2,61 milj. eiro (100 % grants)

- 1,50 milj. eiro 57.7% - Stratēģiskajām (14) t.sk. Ziedot.lv - Ukrainas bēgļu atbalstam Latvijā un programmu (1) iniciatīvām
- 0,87 milj. eiro 33.5% - 6 Programmām un IEM iepriekš noteiktā projekta bilaterālajai komponentei
- 0,23 milj. eiro 8.8% - Atlikušais pieejamais finansējums (DSF atbalsta iespējas Ukrainas bēgļiem Latvijā - procesā iniciatīvu izskatīšana)


EEANorwayGrantsLatvia


[www.eeagrants.lv](http://www.eeagrants.lv)  
[www.norwaygrants.lv](http://www.norwaygrants.lv)

## 2. 2014.–2020. gada plānošanas perioda ES fondu īstenošana

### 2.1. Investīciju aktualitātes un prognozes

Kopā 2 262 projekti piesaistīti **4,4 mljrd. euro** jeb **94 %** no kopējā ES finansējuma 4,64 mljrd. euro<sup>4</sup>, t. sk. 2022. gada 1. pusgadā uzsākti 103 jauni investīciju projekti ar 256,5 milj. euro ES līdzfinansējumu. Pabeigti projekti ir jau vairāk kā puse ar kopējo ES fondu atbalstu **1,4 mljrd. euro**, t. sk. 165 projekti ar ES līdzfinansējumu 182 milj. euro. 2022. gada 1. pusgadā (lielākā daļa ilgtspējīga transporta, vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes, izglītības, pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju jomās).<sup>5</sup> ES fondu investīciju dinamiku skatīt attēlā Nr. 4.

Attēls Nr. 4 “Investīciju progress kumulatīvi līdz 2022. gada 1. jūlijam, (projektu skaits), ES fondu finansējums, milj. euro”

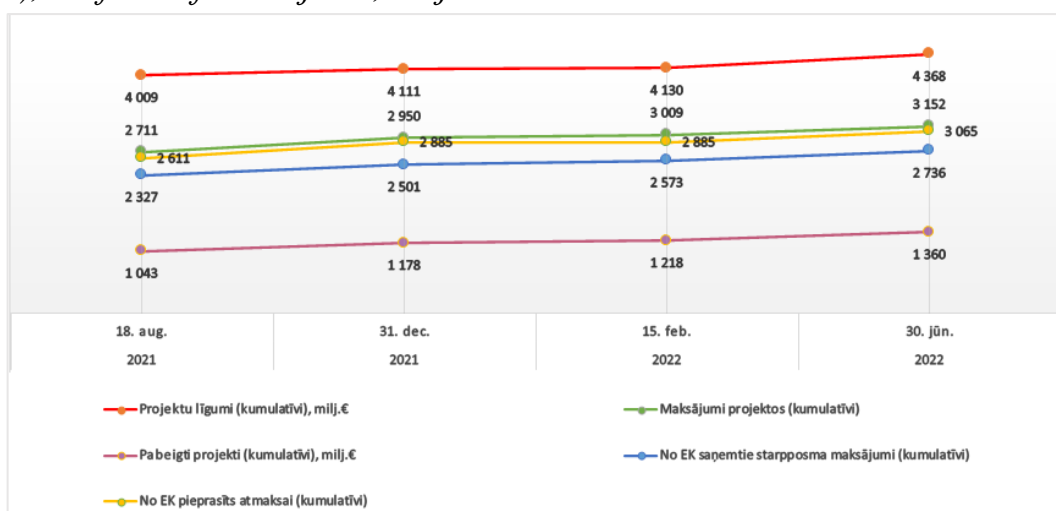


ES fondu **maksājumi projektu īstenošanai** 2022. gadā līdz 2022. gada 1. jūlijam ir **206 milj. euro – 70 %** no attiecīgā perioda prognozes 296 milj. euro (par 90 milj. euro mazāk). 2022. gada maksājumu apjoms projektu īstenošanai kopumā samazinājies par 52 milj. euro, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu (258 milj. euro). Vislielākais ieguldījums 2022. gada 1. pusgadā bija tādās jomās kā videi draudzīga ekonomika (35 milj. euro), sociālā iekļaušana (33 milj. euro), kā arī pētniecībā un inovācijās (27 milj. euro). Kopumā maksājumu tempa samazinājums skaidrojams ar dažādiem faktoriem, t. sk. ģeopolitikās situācijas būtiskā ietekme uz preču piegādes procesiem un izmaksām daudzās sfērās, t. sk.

<sup>4</sup> Tai skaitā no MK atbalstītā finansējuma Covid-19 izraisītās krīzes ietekmes mazināšanai un ekonomikas atlabšanas sekmēšanai DP finansējuma pārdaļu ietvaros (kopā 640,1 milj. euro)\* līdz 2022. gada 30. jūnijam par 460,5 milj. euro ir noslēgti projektu līgumi (vai esošo līgumu grozījumi), kā arī 104,9 milj. euro izmaksāti atbalstam. \* MK 2020. gada 19. maija sēdes protokola Nr. 34 33. § 2. punkts, 2020. gada 2. jūnija sēdes protokola Nr. 38 49. § 3. punkts un 2020. gada 11. augusta sēdes protokola Nr. 47 84. § 2. punkts. Plašāka informācija par pasākumiem un MK pieņemtajiem lēmumiem pieejama FM tīmekļa vietnē, sadaļā COVID-19, [https://www.fm.gov.lv/lv/covid\\_19/Covid\\_19/](https://www.fm.gov.lv/lv/covid_19/Covid_19/).

<sup>5</sup> Informācija par pabeigtiem projektiem ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē <https://www.esfondi.lv/es-fondu-projektu-mekletajs>.


būvniecības procesu kavēšanās, projektu īstenotāju sarežģītumi ar iepirkumu līgumu noslēgšanu, projektu īstenošanas termiņu pagarinājumi, Covid-19 situācijas tiešā vai netiešā ietekmē, kā arī CFLA maksājumu apturēšana uz laiku līdz trūkumu projektu īstenošanā novēršanai no īstenotāju puses<sup>6</sup>. Skatīt attēlu Nr. 5.

*Attēls Nr. 5 “ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda maksājumu prognožu izpilde investīciju jomu dalījumā 2022. gadā, ES fondu finansējums kumulatīvi, milj. euro”*

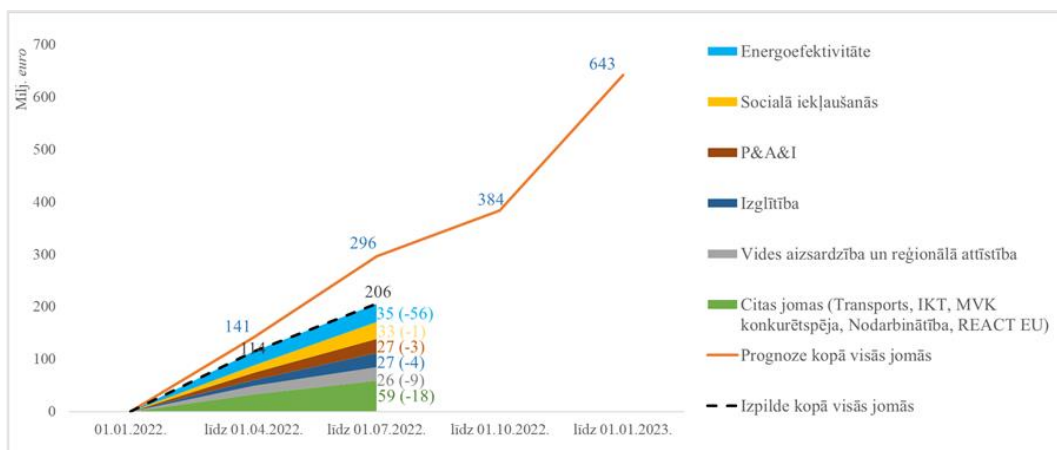

Individuālo projektu maksājumu pieprasījumu 2022. gada pirmajos sešos mēnešos izpilde ir 270,5 milj. euro, novirze no plāna 74,5 milj. euro. Skatīt attēlu Nr. 6.


*Attēls Nr. 6 “Finansējuma saņēmēju 2022. gada maksājumu pieprasījumu iesniegšanas plāni projektu līmenī un to izpilde līdz 2022. gada 1. jūlijam, ES fondu un valsts budžeta līdzfinansējums, milj. euro”*

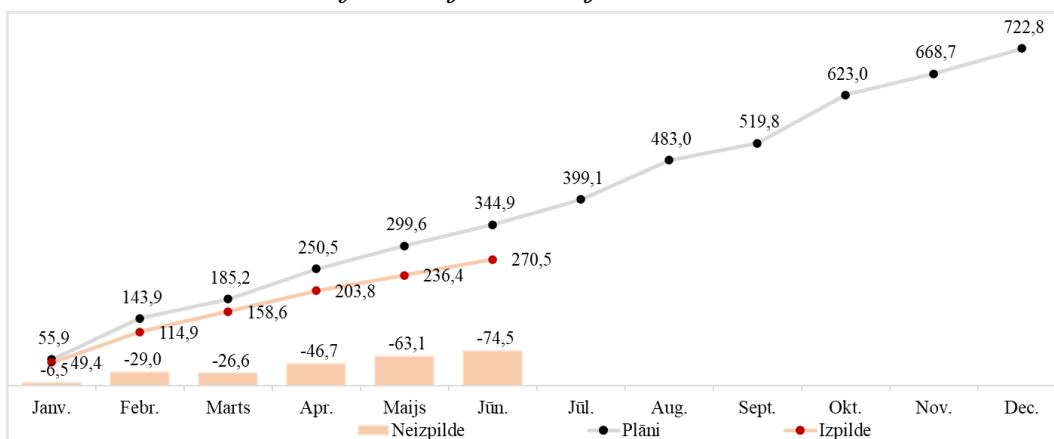

<sup>6</sup> 2022. gadā līdz 2022. gada 1. jūlijam ES fondu investīcijām no valsts budžeta novirzīti 221 milj. euro (samazinājies par 36 milj. euro, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu).

Ņemot vērā iepriekš skaidroto 2022. gadā maksājumu tempa samazinājumu, **2022. gada jūlijā aktualizētā ES fondu investīciju prognoze<sup>7</sup> ir 505 milj. euro<sup>8</sup>** (78,5% no prognozes gada sākumā – par 138 milj. euro mazāk). Sagaidāmi apjomīgākie maksājumi tādās jomās kā videi draudzīga ekonomika (91 milj. euro), sociālā iekļaušanās (64 milj. euro), transports (61 milj. euro), izglītība (60 milj. euro) kā arī pētniecībā un inovācijās (56 milj. euro). Izmantojot riska koeficientu no iepriekšējo gadu pieredzes, attiecīgi indikatīvi prognozējams 2023. gada un 2024. gada investīciju pieaugums, salīdzinot ar 2022. gada sākumā veikto prognozi. Skatīt attēlu Nr. 7 (*ES fondu maksājumu prognoze*).

*Attēls Nr. 7 “ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda maksājumu prognoze 2022. gadā un turpmākajos gados, ES fondu finansējums ikgadēji, milj. euro”*

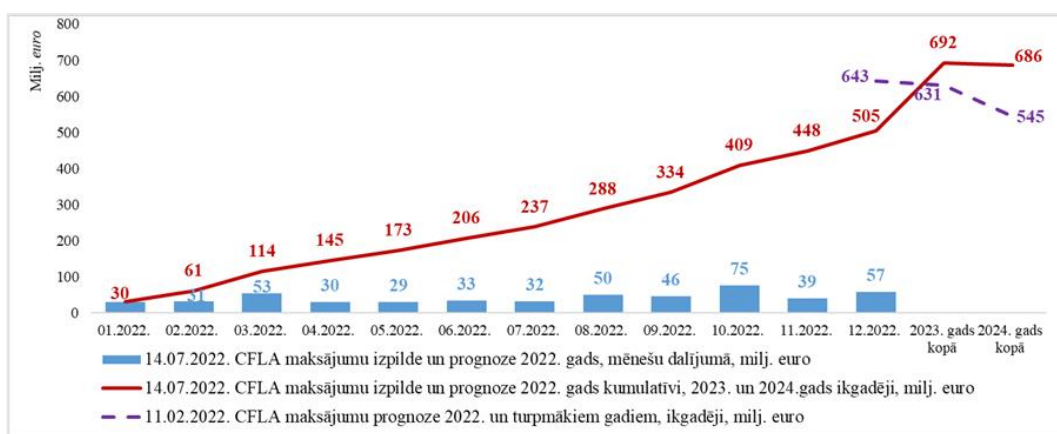

Vienlaikus iepriekšējo gadu intensīvais investīciju progress nodrošinājis EK deklarēto izdevumu ikgadējo mērķu izpildi<sup>9</sup>.

## 2.2. Investīciju risku pārvaldība<sup>10</sup>

Š. g. 1. pusgadā **ģeopolitiskā situācija pasaulē ir radījusi ārkārtas riskus** ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu pabeigšanai līdz plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņa beigām, 2023. gada

<sup>7</sup> ES fondu investīciju prognozei (ES fondu atbalsta maksājumi finansējuma saņēmējiem, ieskaitot REACT-EU papildu finansējumu) 2022. gadam un turpmākiem gadiem par pamatu izmantotas projektu īstenotāju maksājumu pieprasījumu iesniegšanas prognozes, kam CFLA piemēro vēsturiskās izpildes statistikā un zināmo risku vērtējumā balstītus ticamības koeficientus.

<sup>8</sup> 2022. gada jūlijā aktualizētās prognozes samazinājums, salīdzinot ar sākotnējo 2022. gada februāra prognozi, skaidrojams ar plānoto maksājumu pārcelšanu, galvenokārt, elektrovilcienu iegādes lielajā projektā, tramvaju līniju attīstības projektos un ar Rail Baltica saistītajā projektā.

<sup>9</sup> Regulas Nr. 1303/2013 136. (1) pants nosaka, ka EK atceļ saistības jebkurai summas daļai, kas nav izmantota avansa un starpposma maksājumiem vai par kuru līdz 31. decembrim trešajā gadā pēc programmas budžeta saistību gada nav sagatavots maksājuma pieteikums (tā sauc. N+3 princips/mērķis). 2023. gada mērķis izpildīts 2022. gada jūlijā. Atbilstoši EK regulējumam pēc 2023. gada deklarējamo izdevumu mērķa nav – atlikušais finansējums jādeklarē EK līdz plānošanas perioda slēgšanai.

<sup>10</sup> Šajā ziņojumā tiek izcelti aktuālie nozīmīgie riski, kam jāpievērš uzmanība. Ikdienas darbā CFLA un atbildīgās iestādes atbilstoši kompetencei risina dažādus projektu problēmjaudījumus (vadāmi riski) un sniedz atbalstu īstenotājiem pēc iespējas ievērojot “konsultē vispirms” principu.

31. decembrim. Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu rezultātā, īpaši būvniecības nozarē, ir izveidojies ievērojams izmaksu pieaugums. Reaģējot uz ģeopolitiskās situācijas izraisītiem bezprecedenta sarežģījumiem arī ekonomiskajā un investīciju ieviešanas sfērā, lai nodrošinātu lielāku elastīgumu, FM gan individuāli, gan kopā ar citām dalībvalstīm vēršusi EK uzmanību uz nepieciešamību rast EK līmeņa risinājumus sekmīgai ES fondu projektu pabeigšanai.<sup>11</sup> Oficiāla EK atbilde nav saņemta, tomēr no EK komunikācijas dažādu līmeņu sanāksmēs, darba grupās var secināt, ka EK stingri uztur pozīciju nepagarināt izdevumu attiecināmības periodu. EK aicina izmantot EK slēgšanas vadlīnijās<sup>12</sup> skaidrotās citas iespējas projektu pabeigšanai<sup>13</sup>. Līdzīgi CFLA un atbildīgās iestādes skaidro situāciju projektu īstenotājiem, sniedzot nepieciešamo konsultatīvo atbalstu gan tiešajā komunikācijā, risinot individuālu projektu gadījumus, gan horizontāli, publiskojot pieejamos metodiskos palīgmateriālus<sup>14</sup>. Saskaņā ar CFLA sniegto informāciju kopumā individuālos projektos tiek rasti risinājumi projektu pabeigšanai ar ES fondu līdzfinansējumu, pamatotos gadījumos īstenotājiem veicot atbalstāmas izmaiņas darbu apjomos, īstenošanas termiņos, izmantojot aizņemšanās iespējas u.c. Atsevišķos projektos turpinās risinājumu meklējumi.

Saskaņā ar MK lēmumiem<sup>15</sup> ir noteikts princips, ka valsts budžeta virssaistību kompensēšanai (*maksimāli neitrālai ietekmei uz vispārējās valdības budžeta bilanci*) ES fondu **atbrīvoto finansējumu nedrīkst pārdalīt** projektiem vai jaunām projekta darbībām, izņemot: **drīkst atkārtoti izmantot tehniskās palīdzības, ESF, REACT-EU, ERAF IKT un KF 5. prioritārā virziena** “Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte” un **6. prioritārā virziena** “Ilgspējīga transporta sistēma” ietvaros atbrīvoto finansējumu. 2022. gada jūlijā FM aktualizētā prognoze (*piesardzības princips augstas nenoteiktības*

<sup>11</sup> Plašāku informācija par FM komunikāciju ar EK skatīt: 1) FM informatīvajā ziņojumā par pārskata periodu līdz 2022. gada martam (ES fondu tīmekļa vietnē: [http://www.esfondi.lv/sadalā – Materiāli un ziņojumi → Zinojumi Ministru kabinetam Informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda investīciju ieviešanas statusu \(ikmēneša ziņojums\) \(esfondi.lv\)](http://www.esfondi.lv/sadalā-Materiāli_un_zinojumi-→Zinojumi_Ministru_kabinetam_Informatīvais_zinojums_par_Eiropas_Savienības_struktūrfondu_un_Kohēzijas_fonda_investīciju_ieviešanas_statusu_(ikmēneša_zinojums)__(esfondi.lv))), 2) preses relizē par desmit ES dalībvalstu, t. sk. Latvijas, paziņojumu EK par steidzamiem problēmu risinājumiem: [Latvija kopīgā paziņojumā ar citām ES dalībvalstīm vēršas pie EK | Finanšu ministrija \(fm.gov.lv\)](https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/apspriz-krievijas-kara-ietekmi-uz-kohezijas-politikas-istenosanu). 3) FM preses relizē par 2022. gada 2. jūnija Kohēzijas politikas Vispārējo lietu padomes sanākumi (<https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/apspriz-krievijas-kara-ietekmi-uz-kohezijas-politikas-istenosanu>).

<sup>12</sup> Vadlīnijas par to darbības programmu slēgšanu, kuras pieņemtas atbalsta saņemšanai no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda, Kohēzijas fonda un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda (2014.–2020. gada periodā) (2021/C 417/01)(2021/C 417/01):

[https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas\\_slegsana\\_lv.pdf](https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/vadlinijas_slegsana_lv.pdf).

<sup>13</sup> Skatīt EK piedāvātos risinājumus, ja ES fondu projektu nevar pabeigt līdz 2023. gada 31. decembrim: <https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/ja-es-fondu-projektu-nevar-pabeigt-a4-web.pdf>.

<sup>14</sup> Informācija pieejama CFLA tīmekļa vietnē: [Palīgmateriāli izmaksu sadārdzinājuma risku vadībai ES fondu projektos | Centrālā finanšu un līgumu aģentūra \(cfla.gov.lv\)](https://www.cfla.gov.lv/). T. sk. EM sadarbībā ar nozares organizācijām izstrādātajām Vadlīnijām būvdarbu izmaksu indeksācijai: [https://www.em.gov.lv/lv/vadlinijas-buvmaterialu-izmaksu-sadardzinajuma-novertesanai#\\_ftn1](https://www.em.gov.lv/lv/vadlinijas-buvmaterialu-izmaksu-sadardzinajuma-novertesanai#_ftn1) un IUB skaidrojumu par līgumu grozījumu pieļaujamību un veikšanas kārtību: <https://www.iub.gov.lv/lv/jaunums/ligumu-vadiba-krizes-apstaklos-papildinata-20062022>.


<sup>15</sup> MK 2020. gada 22. septembra sēdes protokola Nr. 55 30. § 2.1. un 2.2. punkts, MK 2021. gada 18. marta sēdes protokola Nr. 28 26. § 3. punkts, MK 2021. gada 8. jūnija sēdes protokola Nr. 46 32. § 6. punkts un MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17 34. § 4.1. apakšpunkts.

apstākļos)<sup>16</sup> par iespējām saņemt no EK pilnā apmērā ES fondu finansējumu plānošanas perioda beigās kopumā liecina, ka pieņemtie MK lēmumi attiecībā uz finansējuma atkārtotas izmantošanas iespējām vai ierobežojumiem ir aktuāli, jo:

1) **ERAF** prioritārajos virzienos joprojām prognozējama kopējā attiecināmo izdevumu rezerve, izņemot IKT, t. sk. platjoslas projekts, jomā (2. prioritārajā virzienā).

2) **KF** ieguldījumu kopējā projekcija uzrāda **pieaugošu risku** perioda beigās Latvijai pieejamā ES fondu finansējuma saņemšanai pilnā apjomā 6. prioritārajā virzienā “Ilgtspējīga transporta sistēma”. Negatīva scenārija gadījumā nepietiekama deklarējamo izdevumu apjoma dēļ perioda beigās iespējama neto ES fondu piešķiruma pat virs 50 milj. *euro* zaudēšana Latvijai. Tāpat risku pastiprina apstākļi, ka līdz 2022. gada 1. jūlijam ir ievērojams brīvais KF finansējums, kas nav piesaistīts projektu līgumiem, 172 milj. *euro* jeb 13,8 % no kopējā piešķiruma (skatīt attēlus Nr. 8 un Nr. 9).


*Attēls Nr. 8 “ES fondu finansējuma pamatpiešķirums, par kuru līdz 2022. gada 1. jūlijam nav noslēgti līgumi, milj. euro”<sup>17</sup>*

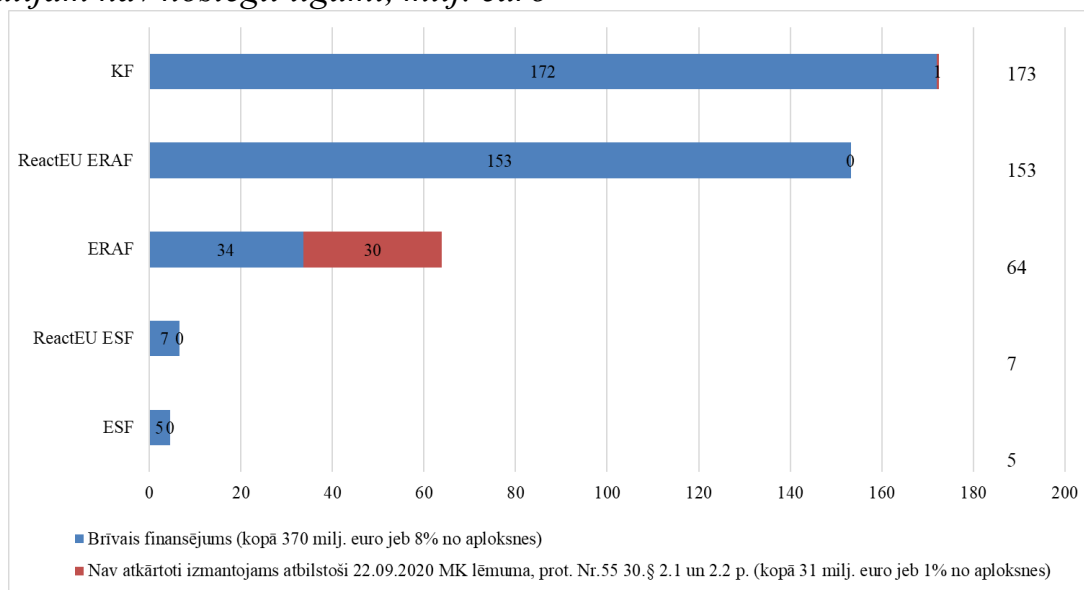

<sup>16</sup> (1) Prognozēs izmantoti pieņēmumi, t. sk. ņemot vērā ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda statistiku par lauztajiem līgumiem un tā ietvaros pārtrauktajiem projektiem, tos pielāgojot ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda specifikai. (2) EK deklarējamo izdevumu pārsnieguma prognoze veidojas t. sk. no papildu virsrašanās un finansējuma saņēmēju pašu lielāka līdzfinansējuma (īpaši pašvaldību projektos). (3) Salīdzinot ar 2022. gada janvāri, prognozes aprēķinā pēc ekspertu metodes iekļauti papildu riski, ņemot vērā Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu rezultātā piemēroto sankciju un pretpasākumu sekas, kā arī tam pakārtotos projektu laicīgas īstenošanas un pārtraukšanas riskus. (4) Ņemts vērā EK nosacījums elastībai starp prioritārajiem virzieniem un fondiem - prioritārais virziens ar deklarējamo izdevumu rezervi perioda beigās var aizstāt deklarējamo izdevumu iztrūkumu citā prioritārajā virzienā 10 % robežās, ja abus prioritāros virzienus līdzfinansē viens fonds (ERAF, ESF vai KF) – Regulas Nr. 1303/2013 130. panta 3. daļa <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02013R1303-20201229> (EK skaidrojumu skatīt jautājumu/atbilžu portālā zem “1.Structural Funds – horizontal questions”, punkts ar nosaukumu “10 % flexibility – Article 130(3) CPR”: Detāla maksājumu prognožu informācija pieejama sadaļā ES fondi 2014 - 2020 → Ieviešana → Ieviešanas plāni un to izpilde → 2022.gads → 1. Maksājumu finansējuma saņēmējiem un deklarējamo izdevumu plāni, izpilde un prognozes: [2022.gads \(esfondi.lv\)](https://www.esfondi.lv) .

<sup>17</sup> Detalizēta informācija par finansējumu, par kuru nav noslēgti līgumi, ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnē esošās statusa tabulas izklājlapā “Bez līguma”: [https://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/statusa\\_tabula\\_2014-2020\\_uz\\_30.06.2022.xlsx](https://www.esfondi.lv/upload/Ieviesana/statusa_tabula_2014-2020_uz_30.06.2022.xlsx) FMzin\_200722\_ESIF

Attēls Nr. 9 “KF pasākumi ar lielākajām pamatpiešķiruma summām, par kurām līdz 2022. gada 1. jūlijam nav noslēgti līgumi, milj. euro”

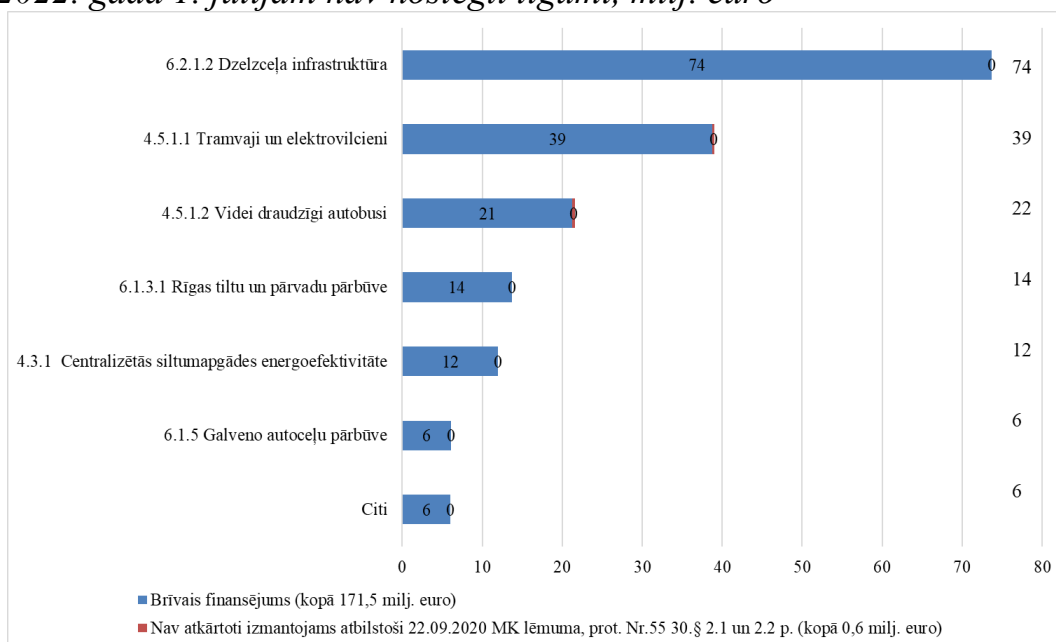

Iepriekš minēto **risku iestāšanās mazināšanai vai novēršanai**, papildus projektu līmeņa uzraudzības un kontroles pasākumiem no CFLA un atbildīgo iestāžu puses, **FM virza ārkārtas un nestandarta risinājumus**. Piemēram, 2022. gada 27. jūlijā EK apstiprinātajos DP grozījumos<sup>18</sup> ir iekļauta 100 % REACT-EU finansējuma likme, ir iestrādāts risinājums, lai būtu iespējams ERAF 5.1.1. SAM “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu pilsētu teritorijās” un 5.1.2. SAM “Samazināt plūdu riskus lauku teritorijās” ERAF izdevumus (daļēji vai pilnā apmērā) deklarēt kā KF. FM turpinās uzraudzīt aktuālāko situāciju un prognozes un organizēs šī risinājuma praktisku realizēšanu (t. i., aktualizējot nepieciešamību veikt tehniskus grozījumus iesaistīto SAM MK noteikumos un secīgi grozījumus projektos/līgumos, maksājumu “pārgrāmatošanu” no ERAF uz KF u. c. darbības).<sup>19</sup>

<sup>18</sup> REACT-EU izmaiņas (t. sk. REACT-EU kopsumma 230,4 milj. euro) - atbilstoši MK 2022. gada 22. marta sēdes protokola Nr. 17, 34. § 3. punktam. MK 2022. gada 22. marta sēdes protokollēmuma Nr. 17, 34. § 4.3. apakšpunkts paredz FM, virzot grozījumus DP, izstrādāt priekšlikumu risinājumiem ES fondu avotu pārstrukturēšanai. Informācija sniegta arī Informatīvajā ziņojumā par Kohēzijas politikas Eiropas Savienības fondu investīciju aktualitātēm līdz 2022. gada 1. februārim (pusgada ziņojums): [https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin\\_280222\\_esif.pdf](https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_280222_esif.pdf)

<sup>19</sup> Vienlaikus, atbilstoši MK 2022. gada 22. marta uzdevumam, EM līdz 2022. gada 31. augustam MK jāapstiprina MK noteikumi par 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīcijām AER izmantošanā un energoefektivitātes paaugstināšana siltumapgādē, t. sk. lai mazinātu 4.3.1. SAM “Veicināt energoefektivitāti un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” piešķirto virssaistību 56 550 000 euro negatīvo ietekmi uz vispārējās valdības budžeta bilanci. Atbilstoši ziņojuma pielikumā aktualizētajai informācijai EM MK noteikumus plāno apstiprināt līdz 2022. gada beigām.  
FMzin\_200722\_ESIF

Lai atvieglotu kara bēgļu no Ukrainas uzņemšanu ES dalībvalstīs un paplašinātu dalībvalstu finansiālo spēju šādu atbalstu sniegt, EK izstrādāja iniciatīvu CARE, kas mērķēta uz potenciālu ERAF, ESF un EAFVP atbalstu ES dalībvalstīm 2014.–2020. gada plānošanas periodā. Tāpat EK ir grozījusi ES fondu regulas, atvieglot finansējuma pārdales nosacījumus dalībvalstīm jau pieejamā ES fondu finansējuma ietvaros (neparedzot papildu finansējumu). Savukārt 2022. gada 29. jūnijā EK paplašinājusi dalībvalstu iespējas veikt iekšējas pārdales ne vien ERAF, ESF un EAFVP ietvaros, bet arī pārdalot KF atlikumus un ietaupījumus Ukrainas kara bēgļu atbalsta pasākumiem (EK rosinātās CARE iniciatīvas papildinājums – *Flexible Assistance to Territories*’ (FAST-CARE)).

Ņemot vērā, ka atbrīvoto 2.1.2. SAM “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” projekta<sup>20</sup> ERAF finansējumu (13,2 milj. euro) SM, atbilstoši ierosinātajam MK noteikumu projektam<sup>21</sup>, neplāno izmantot, tas potenciāli novirzāms šo aktuālo jautājumu risināšanai. Pārstrukturējot DP finansējumu, 10,4 milj. euro plānots novirzīt EAFVP, ņemot vērā LM sniegto informāciju par papildu vajadzībām atbalstam vistrūcīgākajām personām LM administrētajā EAFVP tieši saistībā ar Ukrainas kara bēgļu pieplūdumu Latvijā. Lai īstenotu minētās pārdales, DP grozījumi tiks virzīti saskaņošanai UK un apstiprināšanai MK (indikatīvi 2022. gada nogalē), lai tālāk nodrošinātu abu programmu vienlaicīgu iesniegšanu EK pozitīva lēmuma saņemšanai.

Atlikušā finansējuma (indikatīvi vismaz 2,8 milj. euro) optimālai izmantošanai, kā arī ņemot vērā citu aktuālo projektiem nepiesaistīto ES fondu finansējumu (atlikumi), FM vērtē iespējas DP finansējuma iekšējām pārdalēm, primāri no valsts budžeta jau finansēto atbalsta pasākumu Ukrainas kara bēgļiem integrēšanai DP (t. sk. pārfinansēšanai no, piemēram, KF), lai atslogotu valsts budžetu un mazinātu riskus KF izmantošanai pilnā apmērā. Pamatotā gadījumā FM virzīs priekšlikumus rīcībai, t. sk. iekļaus iepriekš minētajā DP grozījumu priekšlikumā.

Ar energoefektivitāti saistītajos projektos saskaņā ar 2022. gada 5. aprīļa MK sēdes protokolu Nr. 19 (27. §) VAS “Valsts nekustamie īpašumi” projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A. Briāna ielā 13, Rīgā”<sup>22</sup> un Latvijas Universitātes projektā “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā”<sup>23</sup> tika ļauts turpināt projekta īstenošanu ar nosacījumu, ka būvniecības līgumi tiek noslēgti līdz 2022. gada 1. jūlijam. VAS “Valsts nekustamie īpašumi” īstenojamā projektā būvdarbu līgums noslēgts 2022. gada 15. jūlijā, t. i., divas

<sup>20</sup> Projekta Nr. 2.1.2.0/21/I/001 “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” līgums starp CFLA un īstenojamā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” pārtraukts, ņemot vērā valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” kā projekta īstenojamā informāciju par objektīvi neparedzamiem būtiskiem sarežģījumiem un neiespējamu projekta pabeigšanu līdz 2023. gada 31. decembrim; 13 217 837 euro ERAF.

<sup>21</sup> Tiesību akta lieta 22-TA-2119 ”Par Ministru kabineta 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 614 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 2.1.2. specifiskā atbalsta mērķa “Nodrošināt inovatīvu tehnoloģisko risinājumu ieviešanu ārējās robežas kontrolē” īstenošanas noteikumi” atzīšanu par spēku zaudējušiem”

<sup>22</sup> Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/055 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā A. Briāna ielā 13, Rīgā”, kopējās izmaksas 608 309,96 euro (t. sk. 517 063,50 euro ERAF un 91 246,46 euro valsts budžeta finansējums).


<sup>23</sup> Projekts Nr. 4.2.1.2/18/I/034 “Energoefektivitātes paaugstināšana ēkā Kandavas ielā 2, Rīgā”, kopējās izmaksas 624 870,31 euro (t. sk. 221 722,50 euro ERAF un 39 127,50 euro valsts budžeta finansējums).

nedēļas pēc MK noteiktā termiņa. Saskaņā ar finansējuma saņēmēja sniegto skaidrojumu kavējumi būvdarbu līguma slēgšanā saistīti ar nepieciešamību izvērtēt aktuālo situāciju būvniecības sektorā kontekstā ar ģeopolitisko situāciju un ar to saistītajiem riskiem (būvmateriālu sadārdzinājums, piegādes ķēžu maiņa u. c.). Savukārt Latvijas Universitāte līdz 2022. gada 4. augustam nav sniegusi informāciju CFLA par būvdarbu līguma noslēgšanu, projekta īstenošanā nav progresa, kā arī nav veikti maksājumi finansējuma saņēmējam. EM sadarbībā ar CFLA izvērtē turpmākās rīcības scenārijus – gatavot informatīvo ziņojumu MK par projekta īstenošanas turpināšanu, lūdzot būvniecības līguma noslēgšanas termiņa pagarināšanas un projekta īstenošanas turpināšanas atļauju, vai uzsākt līguma laušanas procesu.

### Rādītāji<sup>24</sup>: mērens, bet stabils progress; riski tiek kontrolēti.

Saskaņā ar operatīvajiem datiem līdz 2022. gada 1. jūlijam vidējā rādītāju izpilde ir 75 % no programmā paredzētajām rādītāju mērķa vērtībām<sup>25</sup>. ESF ar 84 % izpildi kopumā uzrāda labāku rādītāju sniegumu nekā ERAF (73 %) un KF (60 %). Labākais progress starp prioritārajiem virzieniem (jomām) ar 90 % vidējo izpildi ir MVK atbalsta un izglītības jomās. Sasniegtas arī pirmās REACT-EU rādītāju vērtības<sup>26</sup>. Attēlā Nr. 10 ir informācija par sešiem DP snieguma ietvara iznākuma rādītājiem, kuriem 65 % sliekšnis<sup>27</sup> vēl ir jāsasniedz.

Attēls Nr. 10 “Snieguma ietvara iznākuma rādītāji ar “augstāku risku”, progress līdz 2022. gada 1. jūlijam riska sliekšni vēl nenasniegušos rādītājos”

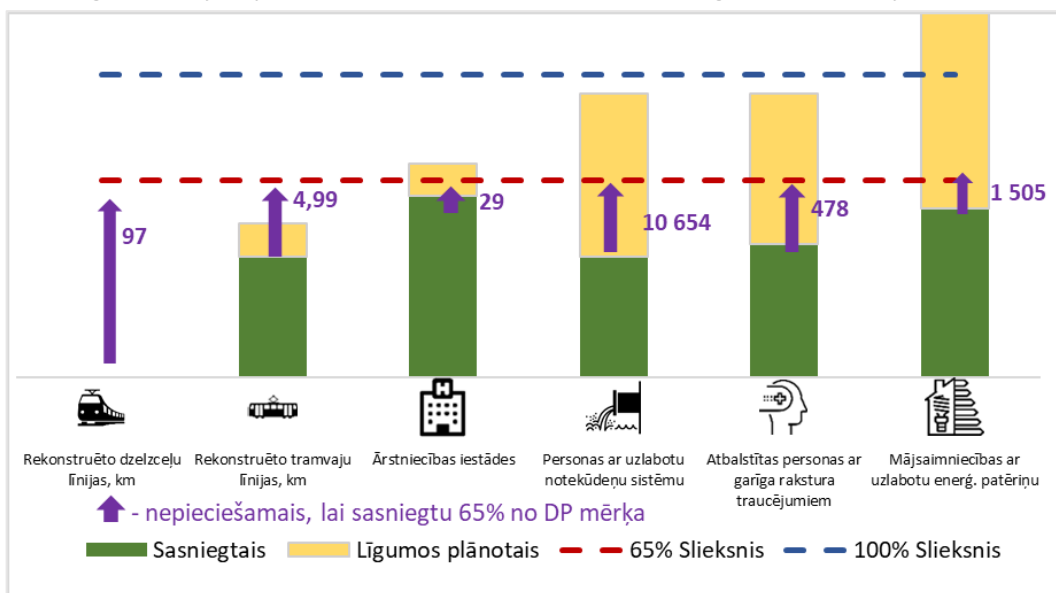

<sup>24</sup> Gada ziņojums par DP īstenošanu, kurā ir iekļautas rādītāju sasniegtās vērtības un sniegti komentāri par būtiskām rādītāju vērtību nobīdēm, ir pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: <https://www.esfondi.lv/gadskartejie-ieviesanas-zinojumi>. Ar DP 2021. gada ziņojuma sniegto vērtību analīzi ir iespējams iepazīties ES fondu tīmekļa vietnē: [2021.gads \(esfondi.lv\)](https://www.esfondi.lv/2021.gads) sadaļā “7. Rādītāju sasniegtās vērtības”.

<sup>25</sup> neskaitot REACT-EU rādītājus, jo to sasniegšana plānota ar 2022. gadu: REACT-EU finansējums ir pieejams no 2021. gada jūlija. Tā izmantošanai tiek veikti nepieciešamie grozījumi SAM ieviešanas nosacījumos, esošajos projektos vai tiek slēgti jaunu projektu līgumi.

<sup>26</sup> Piemēram, enerģijas gada patēriņa samazinājums sabiedriskajās ēkās 643 546,04 kWh/gadā un aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā 147,85 CO<sup>2</sup> ekvivalenta tonnas.

<sup>27</sup> Īpaši uzraugāmi, jo EK var piemērot finanšu korekciju, ja perioda beigās rādītājs sasniegts mazāk kā par 65 %. FMzin\_200722\_ESIF

No 30 DP **snieguma ietvara iznākuma rādītājiem** 65 % no 2023. gada DP mērķa vērtības ir sasniegta 24 gadījumos (2021. gada vidū – 20). Seši rādītāji uzskatāmi par īpaši uzraugāmiem – rādītāju vērtības ir plānots sasniegt esošo projektu līgumu un apstiprināto projektu ietvaros, t. sk.:

(1) 46 % no rādītāja I.4.5.1.ak (CO15) “Jaunuzbūvēto vai uzlaboto tramvaja un metro līniju kopējais garums” DP mērķa vērtības (9,24 km) plānots nodrošināt ar projektu Nr. 4.5.1.1/22/I/001 “Rīgas tramvaja infrastruktūras pielāgošana zemās grīdas tramvaja parametriem”, kurš ir apstiprinās 2022. gada 8. jūlijā un kura līgums noslēgts 2022. gada 5. augustā.

(2) Rādītājs i.6.2.1.ak (CO12a) “Rekonstruēto vai modernizēto dzelzceļa līniju kopējais garums” – DP mērķis ir 150 km, pašreizējā izpilde un projektu līgumos plānotās vērtības ir 0. Mērķa vērtību SM plānojusi sasniegt ar projektu “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai” – projektā paredzēts paaugstināt vilcienu kustības ātrumu posmos Rīga–Daugavpils un Rīga–Jelgava līdz 140 km/h, kopumā modernizējot dzelzceļa infrastruktūru aptuveni 150 km. Kopā finansējums 70 milj. *euro*, t. sk. KF – 59,5 milj. *euro*. Projekts CFLA apstiprināts 2022. gada 13. jūnijā. VAS “Latvijas dzelzceļš” ir vairākkārt lūgusi CFLA pagarināt līguma noslēgšanas termiņu saskaņā ar MK noteikumu Nr. 784 26. punkta nosacījumiem, jo līdz sākotnējam līguma slēgšanas termiņam (2022. gada 27. jūlijs) nebija zināmi IUB atkārtoti iesniegtās pretendenta sūdzības izsludinātās iepirkuma procedūras ietvaros izskatīšanas rezultāti. IUB tīmekļa vietnē 2022. gada 1. augustā publicēts pozitīvs lēmums, kas atļauj slēgt iepirkuma līgumu. Neskatoties uz to, VAS “Latvijas dzelzceļš” nav noslēgusi līgumu ar CFLA. CFLA ir lūgusi VAS “Latvijas dzelzceļš” līdz 12. augustam iesniegt skaidru rīcības plānu ar projektā plānotajām darbībām un šo darbību termiņiem projekta ieviešanai līdz 2023. gada 31. decembrim noteiktajā apjomā. CFLA vērtējumā pastāv ļoti augsts risks sekmīgai projekta pabeigšanai iepriekš minētajā termiņā, ņemot vērā, ka iepirkuma līgumu ar būvniecības veicēju VAS “Latvijas dzelzceļš” vēl nav noslēdzis. SM, CFLA un projektu īstenotājs rīko regulāras ikmēneša sanāksmes un citus pasākumus risku vadības ietvaros. **VAS “Latvijas dzelzceļš” un SM nepieciešams bez tālākas kavēšanās pieņemt lēmumu par turpmāko projekta īstenošanu un informēt par to CFLA, t. sk. par projektam plānoto KF 59,5 milj. *euro* izmantošanu, lai Latvija kopumā nezaudētu šī finansējuma iespējas.**

**Lielle projekti**<sup>28</sup> – ikmēneša projektu progresa un risku pārskatos (aktuālais 2022. gada jūlijā) īstenotāju ziņotie riski, t. sk. aktuālais sakarā ar Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu ietekmi, joprojām tiek vadīti ar pašu rīcībā esošiem pasākumiem. Projektu īstenotāji ar iepirkumu līgumu veicējiem

<sup>28</sup> Saskaņā ar Regulas Nr. 1303/2013 100. pantu “Liellais projekts”, kura kopējās attiecināmās izmaksas >50 milj. *euro* (vides jomā) vai 75 milj. *euro* (transporta jomā), var saņemt ES līdzfinansējumu, ja ir EK pozitīvs lēmums. Finanšu instrumenti nav lielle projekti Regulas izpratnē.

turpina rast risinājumus, lai īstenotu projektus esošā plānošanas perioda izdevumu attiecināmības termiņā un projektu budžeta ietvaros:

1) Projekts **“Rīgas un Pierīgas pasažieru pārvadājumu nodrošināšanai nepieciešamo elektrovilcienu iegāde”**<sup>29</sup> – projektā 2022. gada jūnija beigās ir piegādāti pirmie vilcienu vagoni, tie tiek gatavoti testēšanai un sertifikācijas procesa uzsākšanai. Visu projektā paredzēto vilcienu vagonu piegāde paredzēta līdz 2023. gada beigām.

2) PSKUS lielais projekts **“Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas jaunās A2 ēkas attīstība”** – FM 2022. gada 14. jūnijā iesniedza EK lēmuma pieņemšanai projekta grozījumu dokumentāciju (*pamatojot projekta izstrādes laikā konstatētās nepieciešamās tehnoloģiskās/funkcionālās izmaiņas un budžeta palielinājumu*)<sup>30</sup>. EK pozitīva lēmuma gadījumā projekta līguma grozījumu slēgšana ar CFLA varētu notikt 2022. gada septembrī. Projektā notiek būvdarbi un pirmās piegādes (jaundzimušo reanimācijas galds).

### 2.3. Vadības un kontroles sistēmas darbība

Vairāki sistēmiskie uzlabojumi tiek veikti un tiks īstenoti, pamatojoties uz ES un citu institūciju veiktiem auditiem. Piemēram, ņemot vērā EK viedokli par Eiropas revīzijas palātas likumdošanas audita konstatējumiem par neatļautu sadalītu iepirkumu atsevišķu ceļu projektu ietvaros, FM, IUB, CFLA uzsāka darbu pie uzlabojumiem Elektronisko iepirkumu sistēmā, lai ar iepirkumu plānu kontroles pasākumiem mazinātu sadalītu iepirkumu risku, kā arī sniegtu atbalstu projektu īstenotājiem šāda riska vērtēšanā. Par konkrētā risinājuma ieviešanu un iestrādi EIS notiek sarunas ar VRAA.

Saistībā ar EK auditu par kompetences centriem secinājumi par papildu nepieciešamajiem uzlabojumiem būs pēc EK gala ziņojuma saņemšanas (indikatīvi, pēc 2022. gada novembra)<sup>31</sup>.

### Apstrīdēto CFLA lēmumu izskatīšana VI<sup>32</sup>

No 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 30. jūnijam VI ir saņemti septiņi jauni apstrīdēšanas iesniegumi CFLA un finansējuma saņēmēja noslēgtās vienošanās izpildes ietvaros<sup>33</sup>, kā arī pieņemti seši lēmumi par iepriekšējā pārskata perioda beigās vēl procesā esošajām lietām<sup>34</sup>. Apstrīdētie CFLA lēmumi

<sup>29</sup> Līgums ar CFLA par lielā projekta īstenošanu ir noslēgts 2022. gada 27. maijā; kopējās attiecināmās izmaksas 161,2 milj. euro, t. sk. ES fondu finansējums 114,2 milj. euro. [PROJEKTI: AS Pasažieru vilciens \(pv.lv\)](#).

<sup>30</sup> Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 140,4 milj. euro, t. sk. ES fondu finansējums 83,7 milj. euro.

<sup>31</sup> Detalizēta informācija par investīcijām kompetenču centros, EK konstatējumiem un turpmāko rīcību ir sniegta EM informatīvajā ziņojumā, kas izskatīts MK 2022. gada 14. jūlijā (prot. [Nr. 36/109.§](#)). Pieejams TAP (projekts 22-TA-1548): [https://tapportals.mk.gov.lv/legal\\_acts/03616c2c-0392-46e3-b556-1153333a434f](https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/03616c2c-0392-46e3-b556-1153333a434f)

<sup>32</sup> Finansējuma saņēmējs, kas ir publiska persona, var VI apstrīdēt CFLA pieņemto lēmumu par piešķirto finanšu līdzekļu izmaksāšanu, t. sk. konstatētajām neatbilstībām, vai citu lēmumu, ja vienošanās nav panākta sarunu ceļā.

<sup>33</sup> Apstrīdēšanas iesniegumi iesniegti: pētniecības, tehnoloģiju attīstība un inovācijas jomā – trīs iesniegumi; izglītības, prasmju un mūžizglītības jomā – četri iesniegumi; sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas jomā – viens iesniegums. No iepriekš minētajiem viens iesniegums iesniegts vienlaikus divās jomās.

<sup>34</sup> Izskatīti apstrīdēšanas iesniegumi: 1) pa vienam iesniegumam šādās jomās – pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas; IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi; Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās

ir par publisko iepirkumu strīdiem, t. sk. par interešu konflikta jautājumiem iepirkuma ietvaros, SAM MK noteikumu prasībām projekta izdevumu attiecināšanā, kā arī konkurences pārkāpumiem saistībā ar Konkurences padomes konstatējumiem būvnieku karteļa lietā<sup>35</sup>. Visi trīspadsmit CFLA lēmumi ir atstāti negrozīti. Papildus VI saņemti arī divi privāto tiesību juridisku personu iesniegumi par CFLA pieņemtajiem lēmumiem līguma izpildes ietvaros<sup>36</sup>. Abos gadījumos VI nebija pamata apšaubīt CFLA pieņemto lēmumu.

No 2022. gada 1. februāra līdz 2022. gada 30. jūnijam saņemti divi projektu iesniegumu atlasu rezultātu apstrīdēšanas iesniegumi<sup>37</sup>. Vienā gadījumā CFLA lēmums ir atstāts negrozīts, bet otrā – izbeigta lietas izskatīšana sakarā ar CFLA pieņemto lēmumu par sava sākotnējā lēmuma atcelšanu.

Apstrīdēšanas iesniegumu izskatīšanas procesa ietvaros VI ir pārliecinājusies, ka **CFLA pieņemtie lēmumi** šī pusgada ziņojuma periodā **ir tiesiski un pamatoti**. Attiecībā par būvnieku karteļu lietu, ņemams vērā, ka noris aktīvas tiesvedības Administratīvajā apgabaltiesā par Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmuma Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu” tiesiskumu un pamatotību. Tiesvedības rezultāts var ietekmēt minētā Konkurences padomes lēmuma, kā arī secīgi CFLA pieņemto finansējuma saņēmējiem nelabvēlīgo lēmumu saturu (iestāde izdod jauna satura lēmumus).

### Projektos konstatētie pārkāpumi

No plānošanas perioda sākuma līdz 2022. gada 30. jūnijam ES fondu projektos konstatēti NVI 64 milj. *euro* publiskā finansējuma (attēls Nr. 11) jeb 1,45 % no projektu maksājumu pieprasījumos iekļautā, no tiem atgūti 29 milj. *euro*.

---


nozārēs; 2) pa diviem iesniegumiem vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes jomā un izglītības, prasmju un mūžizglītības jomā. No iepriekš minētajiem viens iesniegums izskatīts vienlaikus divās jomās.

<sup>35</sup> Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmums Nr. 22 “Par pārkāpuma konstatēšanu un naudas soda uzlikšanu”. Pieejams Konkurences padomes tīmekļa vietnē: [Lēmums Publiskojamā versija.pdf \(kp.gov.lv\)](#).

<sup>36</sup> sociālās iekļaušanas un nabadzības apkarošanas, vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitātes jomās.


<sup>37</sup> 4.2.2 SAM “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” 5. atlasē kārtas un 5.4.3.2 SAMP “Kompleksu apsaimniekošanas pasākumu īstenošana Natura 2000 teritorijās” (atbildīgā iestāde – VARAM).

*Attēls Nr. 11 “2014.–2020. gada plānošanas perioda neatbilstības veidu dalījumā, atgūstamais publiskais finansējums, euro”*

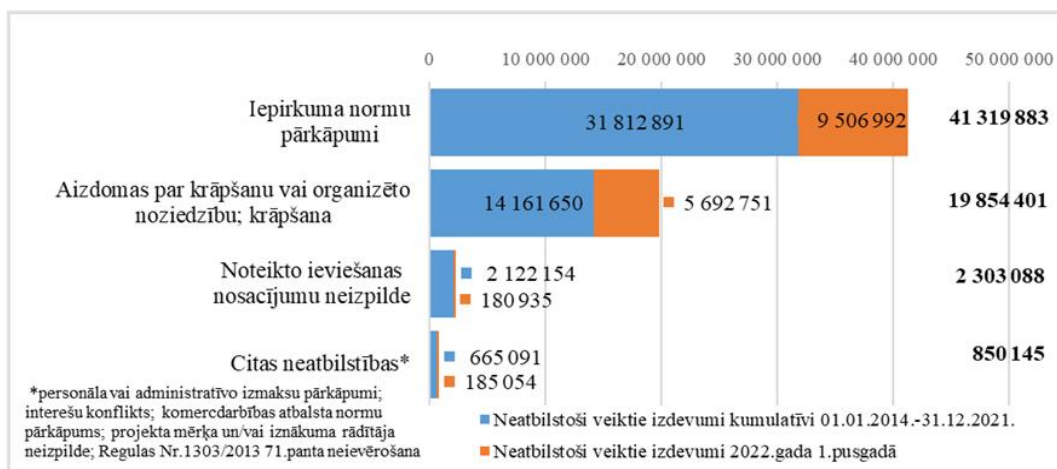

2022. gada 1. pusgadā konstatēti 15,6 milj. *euro* NVI<sup>38</sup> (attēls Nr. 12), kas ir par 22% mazāk, nekā 2021. gada 2. pusgadā – ievērojami samazinājušies gan iepirkumu normu pārkāpumi<sup>39</sup> un noteikto ieviešanas nosacījumu neievērošanas pārkāpumi, gan citas neatbilstības.

*Attēls Nr. 12 “2014.–2020. gada plānošanas perioda 2022. gada pirmajā pusgadā konstatētās neatbilstības projekta iesniedzēju grupu dalījumā, atgūstamais publiskais finansējums, euro”*

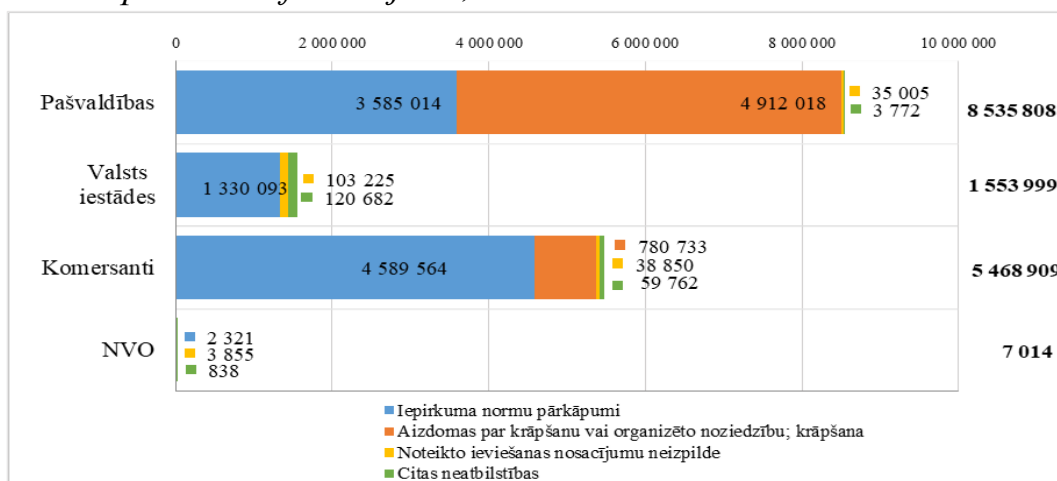

Nodrošinājuma valsts aģentūras (turpmāk – NVA) īstenotajā projektā<sup>40</sup> konstatēts iepirkuma normu pārkāpums<sup>41</sup> un par neatbilstoši veiktiem

<sup>38</sup> Papildus tam pašvaldību finansējums – 1,2 milj. *euro*, cits publiskais finansējums 6 tūkst. *euro*; privātais – 1,9 milj. *euro*.

<sup>39</sup> Tas skaidrojams ar 2021. gada 2. pusgadā būtiski lielo konstatēto iepirkumu normu pārkāpumu apjomu, pamatojoties uz Konkurences padomes 2021. gada 30. jūlija lēmumu.

<sup>40</sup> Projekts Nr. 4.2.1.2/17/I/026 “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti”.

<sup>41</sup> Izskatot noslēguma maksājuma pieprasījumu, CFLA 2022. gada 11. februārī konstatēja iepirkuma normu pārkāpumu NVA projektā. Iepirkuma piedāvājumu vērtēšanas laikā iepirkumu komisija nav veikusi Publiskā iepirkumu likumā noteikto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi attiecībā uz apakšuzņēmēju, uz kura iespējām balstījās

izdevumiem atzīti 50 590,65 *euro* (ERAF 43 002,04 *euro*, valsts budžeta finansējums 7 588,61 *euro*), no tiem 45 683,55 *euro* CFLA ieturēja no noslīguma maksājuma pieprasījuma. Savukārt, tā kā projekts ir pabeigts, atgūstamos izdevumus 4 907,10 *euro* (ERAF 4 171,03 *euro*, valsts budžets – 736,07 *euro*) NVA rosina<sup>42</sup> MK atbalstīt attiecināt uz ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta virssaistībām. NVA ir izvērtējusi situāciju un secinājusi, ka NVI ir radušies cilvēciskas kļūdas dēļ – lielā darba apjoma, darbinieku mainības, nepietiekamības rezultātā. Lai nepieļautu šādus pārkāpumus turpmāk, NVA ir veikusi pārrunas ar iepirkuma komisijas dalībniekiem, līgumos noteiktajām atbildīgajām personām un sniegusi norādījumi turpmākām darbībām.

### 3. ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas periods

FM 2022. gada 25. maijā EK oficiāli iesniedza Partnerības līgumu Eiropas Savienības investīciju fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodam, izpildot priekšnoteikumu programmas oficiālai iesniegšanai EK. 2022. gada 27. jūnijā **EK apstiprināšanai ir iesniegta Eiropas Savienības kohēzijas politikas programma 2021.–2027. gadam** (Programma). EK lēmums par Programmas apstiprināšanu sagaidāms 2022. gada 4. ceturksnī. Tomēr, negaidot EK lēmumu, **ministrijām jāturpina un aktīvi jāuzsāk darbs pie konkrēto investīciju nosacījumu izstrādes un saskaņošanas**. Lai vadītu un uzraudzītu investīciju uzsākšanas plānveida progresu, FM rosina ar MK lēmumu nostiprināt iestādēm ievērojamo regulējuma izstrādes un projektu iesniegumu atlases uzsākšanas laika grafiku (iekļauts šī ziņojuma pielikumā)<sup>43</sup>. Tāpat savlaicīgi investīciju sagatavošanas posmā **īpaši svarīgi ministrijām iesaistīt pilsonisko sabiedrību**. Saskaņā ar aktualizēto atbildīgo iestāžu sniegto informāciju 2022. gadā ir plānots uzsākt investīcijas (projektu iesniegumu atlases) 428,8 milj. *euro* (t. sk. ES fondu finansējums 364,5 milj. *euro*) sociālās labklājības, izglītības, uzņēmējdarbības un energoefektivitātes jomas pasākumos indikatīvi (kopā 10 SAM pasākumi un kārtas).

**LM un SM atbilstoši kompetencei nepieciešams iespējami ātri pabeigt šādu divu ieguldījumu priekšnosacījumu<sup>44</sup> izpildei nepieciešamo nozaru**

pretendents – apakšuzņēmējam uz lēmuma pieņemšanas dienu bijis nodokļu parāds, attiecīgi tas bija izslēdzams no dalības iepirkumā.

<sup>42</sup> Saskaņā ar MK 2015. gada 8. septembra noteikumu Nr. 517 “Kārtība, kādā ziņo par konstatētajām neatbilstībām un atgūst neatbilstoši veiktos izdevumus Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda ieviešanā 2014.–2020. gada plānošanas periodā” 19.3. apakšpunktu un 25. punktu.

<sup>43</sup> Tāpat, informācija par aktuālāko regulējuma statusu regulāri tiek atjaunota un ir pieejam ES fondu tīmekļa vietnē <https://www.esfondi.lv/planosana-1> (Programmas papildinājums (informatīvs materiāls)).

<sup>44</sup> (1) Regulas Nr. 2021/1060 preambula “*Ja ir noteikts termiņš, kurā Komisijai jārikojas attiecībā uz dalībvalstīm, Komisijai laikus un efektīvi būtu jāņem vērā visa vajadzīgā informācija un dokumenti. Ja jebkāda veida dokumenti, ko dalībvalstis iesniedz saskaņā ar šo regulu, ir nepilnīgi vai neatbilst šīs regulas un konkrētu fondu regulu prasībām, tādējādi neļaujot Komisijai rīkoties, pamatojoties uz pilnīgu informāciju, minētais termiņš būtu jāaptur līdz brīdim, kad dalībvalstis ir izpildījušas regulatīvās prasības. Turklāt, tā kā Komisijai ir liegts veikt maksājumus par izdevumiem, kas radušies saņēmējiem un samaksāti, īstenojot darbības, kuras saistītas ar konkrētiem mērķiem, attiecībā uz kuriem nav izpildīti veicinošie nosacījumi, kas ir iekļauti maksājuma pieteikumos, attiecībā uz šādiem izdevumiem nebūtu jānosaka termiņš, kurā Komisijai jāveic maksājumi.*”; (2) Regulas Nr. 2021/1060 3. pielikumā

stratēģiju **izstrādi, saskaņošanu un nodrošināt to apstiprināšanu MK** – Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam un Dzelzceļa infrastruktūras attīstības plāns 2022.–2026. gadam (*LM un SM plāno to paveikt līdz 2022. gada beigām saskaņā ar iestāžu sniegto informāciju FM*).

Vienlaikus FM turpina aktīvu **darbu pie horizontālā normatīvā regulējuma** (saskaņošanas stadijā par pārbaužu veikšanu, maksājumu veikšanas kārtību, uzraudzību un izvērtēšanu, neatbilstību konstatēšanas kārtību u.c.) izstrādes un virzības apstiprināšanai MK, lai izpildītu MK deleģējumu līdz 2022. gada 31. augustam nodrošināt horizontālā regulējuma izstrādi. Jau ir stājušies spēkā ES fondu administrēšanai, finanšu kontroles un revīzijas nodrošināšanai paredzētā finansējuma (tehniskās palīdzības) izmantošanas noteikumi<sup>45</sup>, kā arī noteikumi par ES fondu revīzijas iestādes funkcijām<sup>46</sup>.

Nemot vērā iepriekš minēto informāciju par investīciju uzsākšanas gatavības stadiju, šobrīd nav iespējams reālistiski prognozēt investīciju budžeta izdevumu plūsmu. Vienlaikus, lai paredzētu valsts budžetā finansējumu projektu īstenošanai, FM šobrīd to nosaka tādā minimālā apjomā, lai Latvija nezaudētu ES finansējuma piešķirumu atbilstoši “N+3” nosacījumam<sup>47</sup> (N+3 mērķis) – maksājumu pieteikumā EK pieprasītā ES fondu līdzfinansējuma daļa<sup>48</sup>. Pirmais kumulatīvi izpildāmais N+3 mērķis ir 2025. gada beigās. Attiecīgi, lai to sasniegtu budžeta izdevumiem investīciju projektu ieviešanai jāsasniedz ~1,4 mljrd. *euro*<sup>49</sup>. Skatīt attēlu Nr. 13. Pie nosacījuma, ja atbildīgās iestādes nodrošina šī ziņojuma pielikumā esošo SAM ieviešanas nosacījumu un atlasu uzsākšanas laika grafiku bez būtiskiem kavējumiem, ievērojot normālu projektu ieviešanas ciklu, līdz 2023. gada beigām atlasēs pakāpeniski izsludināmais finansējums (3,6 mljrd. *euro* ES fondu finansējuma) varētu nodrošināt nepieciešamos investīciju izdevumus N+3 izpildei. Tādēļ ir kritiski svarīgi atbildīgajām iestādēm nodrošināt nepieciešamās darbības, lai būtiski nenovirzītos no iepriekš minētā investīciju uzsākšanas plāna.

---

(horizontālie ieguldījumu priekšnosacījumi, kas attiecas uz visiem specifiskajiem atbalsta mērķiem) un 4. pielikumā (specifiskie ieguldījumu priekšnosacījumi, kas attiecas uz konkrētiem specifiskajiem atbalsta mērķiem):

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R1060&qid=1625116684765>.

<sup>45</sup> MK 2022. gada 14. jūnija noteikumi Nr. 342 “Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu”. Spēkā no 2022. gada 18. jūnija. [Noteikumi par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam tehniskās palīdzības īstenošanu \(likumi.lv\)](#). Tehniskā palīdzība paredzēta ES fondu administrēšanai, finanšu kontroles, revīzijas nodrošināšanai, mācību, konferenču, semināru norisei un dalībai, publicitātes nodrošināšanai, IT sistēmas izveidei un uzturēšanai.


<sup>46</sup> MK 2022. gada 14. jūlija noteikumi Nr. 427 “Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā”. Spēkā no 2022. gada 16. jūlija. [Revīzijas iestādes funkciju nodrošināšanas kārtība Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas periodā \(likumi.lv\)](#).

<sup>47</sup> Atbilstoši Regulas Nr. 2021/1060 ([Publications Office \(europa.eu\)](#)) 105. pantam: “Komisija atceļ saistības attiecībā uz jebkuru programmas summu, kura līdz 31. decembrim trešajā kalendārējā gadā pēc budžeta saistību gada nav izmantota priekšfinansējumam [...] vai par kuru nav iesniegts maksājuma pieteikums [...], par 2021.–2026. gadu”.

<sup>48</sup> Prognoze nemainīga kopš 2022. gada janvāra. Kopējā prognozētajā budžetā +5 milj. *euro*, ko rada finansējuma sadalījuma izmaiņas starp ES fondiem ar atšķirīgu valsts budžeta līdzfinansējuma likmi katrā no ES fondiem atbilstoši 2014-2020 ES fondu perioda statistikai.

<sup>49</sup> 2022. gada prognozē izmantota informācija par MK apstiprināto ātrāk uzsākamo SAM ieviešanas nosacījumiem, t. sk. indikatīvo finanšu plūsmu, savukārt tālāko gadu prognoze balstīta uz 2014.–2020. gada plānošanas perioda pieredzi par investīciju pakāpeniskiem uzsākšanas tempiem.

Attēls Nr. 13 “ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīcijām nepieciešamā minimālā budžeta izdevumu plūsma, indikatīvi (ES fondu un valsts budžeta finansējums, t. sk. valsts budžeta dotācijas pašvaldībām), milj. euro”

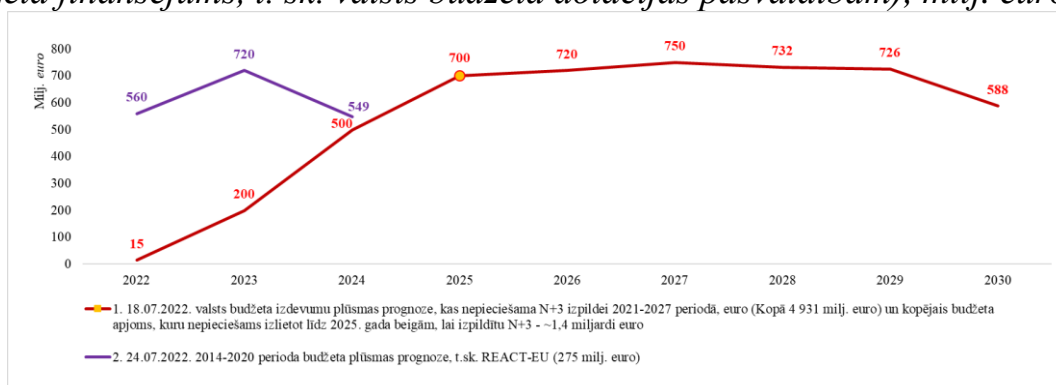

#### 4. Atveseļošanas fonda plāna ieviešana<sup>50</sup>

**AF plāns ar 1,82 mljrd. euro** ES finansējumu ir aktīvā ieviešanā. FM sadarbībā ar atbildīgajām ministrijām un iestādēm ir uzsākusi gatavot **priekšlikumus AF plāna grozījumiem**, t. sk. izvērtējot kritiski nepieciešamos precizējumus saistībā ar būvniecības projektu sadārdzinājumu un ietekmi uz ieviešanas grafiku<sup>51</sup>. Balstoties uz jaunākajām ekonomikas prognozēm, kas tiek izmantotas AF finansējuma aprēķinā, Latvijai pieejamais AF finansējums indikatīvi varētu palielināties par 8 milj. euro. Tāpat EK 2022. gada 8. martā ir nākusi klajā ar priekšlikumu AF papildu piešķirumam enerģētikas jomai – “RePowerEU” iniciatīva. Pēc FM aprēķiniem, Latvija no šobrīd EK piedāvātās “RePowerEU” iniciatīvas priekšlikuma papildu finansējuma varētu saņemt 109,05 milj. euro. Par šī piešķiruma izmantošanu AF plāna ietvaros sākotnējo priekšlikumu gatavo EM. Savukārt, AF aizdevums plānots tādām AF reformām un investīcijām, kas paredzētas esošajā un plānotajā valsts budžetā un atbilst AF regulas<sup>52</sup> prasībām. Jaunu reformu vai investīciju finansēšana aizdevuma ietvaros šobrīd netiek plānota. 2022. gada **17. jūnijā FM ir iesniegusi EK pirmo AF maksājumu pieprasījumu** par 231 milj. euro par 9 sasniegtajiem 2021. gada reformu un investīciju atskaites punktiem (skatīt 3. attēlu ziņojuma sākumā), par ko **2022. gada 29. jūlijā EK apstiprināja pozitīvu sākotnējo novērtējumu**. Pozitīva EK galējā novērtējuma gadījumā **sagaidāmais EK maksājums Latvijai valsts budžeta ieņēmumos ir 201 milj. euro**<sup>53</sup>.

<sup>50</sup> Plaša informācija gan par Latvijai, gan citām ES dalībvalstīm pieejamo AF finansējumu un tā izmantošanu ir EK tīmekļa vietnē

[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/index.html?lang=en).

<sup>51</sup> [Informatīvais ziņojums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna grozījumiem \(mk.gov.lv\)](https://www.mk.gov.lv)

<sup>52</sup> Eiropas parlamenta un Padomes regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN>

<sup>53</sup> No katra maksājuma pieprasījuma Latvijai atskaita 13 %, tā dzēšot EK 2021. gada septembrī Latvijai izmaksāto AF priekšfinansējumu 237,4 milj. euro. Maksājuma pieprasījuma izskatīšanas EK kārtība atrunāta Eiropas

**2022. gadā** Latvijai ir jāizpilda **49 atskaites punkti un mērķi un otrs maksājuma pieprasījums par 503 milj. euro** jāiesniedz EK 2023. gada 2. ceturksnī vai ne vēlāk kā līdz 2023. gada beigām, lai Latvija saņemtu šo AF finansējumu. Ziņojot EK par AF plāna ieviešanas progresu aktuālajā pārskata periodā, Latvijai līdz 2022. gada 30. augustam jāsniedz EK informācija par kopējo rādītāju progresu<sup>54</sup> un līdz 2022. gada 15. oktobrim īstenošanas progressa pusgada ziņojumu (atskaites punktu/ mērķu sasniegšanas progress, kas jāsniedz līdz 2023. gada 30. septembrim un uzraudzības rādītāju progresu, kas jāizpilda līdz 2023. gada 30. martam)<sup>55</sup>. Iestādes ir jau iepriekšējā pārskata periodā informējušas par prognozētiem atskaites punktu/mērķu sasniegšanas kavējumiem, par ko ir sniegta informācija arī FM ziņojumā MK<sup>56</sup>. Savukārt aktuālā progressa informācija ministrijām un Valsts kancelejai līdz kārtējā gada 25. janvārim un 25. jūlijam bija jāievada KP VIS, kas pielāgota AF vajadzībām<sup>57</sup>. 2022. gada 2. augustā, apkopojot KPVIS AF ievadīto informāciju attiecībā par atskaites punktiem, mērķiem un uzraudzības rādītājiem, FM konstatēja, ka vairumā gadījumu dati nav tikuši ievadīti nemaz<sup>58</sup> vai ir nepieciešami precizējumi. 2022. gada 4. augustā FM ir lūgusi iestādes līdz 2022. gada 10. augustam pārliecināties par KPVIS AF ievadīto datu kvalitāti un nodrošināt pilnvērtīgu trūkstošās informācijas ievadi, lai FM varētu sagatavot kopējo progressa pārskatu iekļaušanai ziņojumā MK un tālāk ziņošanai EK.

Saskaņā ar MK 2022. gada 22. marta sēdes protokolu Nr. 17, 34. § 8. punkta 7. apakšpunktu ministrijām un institūcijām, kas atbildīgas par Atveseļošanas fonda plāna investīciju un reformu ieviešanu, jāievieš efektīva risku pārvaldība un, konstatējot būtiskus riskus ar divu mēnešu kavējumu saistošo atskaites punktu un mērķu sasniegšanā, steidzamības kārtībā jāinformē MK (vai izņēmuma kārtā vienoties ar FM par informācijas iekļaušanu FM pusgada

---

Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 24. pantā, t. sk. 24. panta 4. apakšpunkts: *“Ja Komisija sniedz pozitīvu sākotnējo novērtējumu, ka ir apmierinoši izpildīti attiecīgie starpposma rādītāji un mērķrādītāji, tā iesniedz savus konstatējumus Ekonomikas un finanšu komitejai un līdz tās atzinumu, ka attiecīgie starpposma rādītāji un mērķrādītāji ir apmierinoši izpildīti. Komisija savā novērtējumā ņem vērā Ekonomikas un finanšu komitejas atzinumu.”*. [“NextGenerationEU”: EK apstiprina pozitīvu sākotnējo novērtējumu par Latvijas pieprasījumu izmaksāt 201 miljonus eiro Atveseļošanas un noturības mehānisma ietvaros \(europa.eu\)](#).

<sup>54</sup> Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 12. februāra Regulas (ES) Nr. 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 29. pantā noteikto.

<sup>55</sup> 2021. gada 12. februāra Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/241, ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu, 22., 27. pants. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN>; Eiropas Padomes 2021. gada 6. jūlija lēmums par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna izvērtējuma apstiprināšanu; EK un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīgums <https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1>.

<sup>56</sup> Plašāka informācija par 2022. gada 29. aprīlī EK iesniegto pusgada progressa ziņojumu, t.sk. atsevišķu 2022. gadā sasniedzamo rādītāju izpildes kavēšanos, bet ar iespēju nodrošināt to izpildi līdz nākamajam maksājumu pieprasījumam EK (indikatīvi līdz 2023. gada 2. ceturksnim) ir sniegta FM ikmēneša informatīvajā ziņojumā par ES fondu investīciju ieviešanas statusu par pārskata periodu līdz 05.2022. Pieejams ES fondu tīmekļa vietnē: [https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin\\_200522\\_ikmen\\_esif.pdf](https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_200522_ikmen_esif.pdf).

<sup>57</sup> Saskaņā ar MK 2021. gada 7. septembra noteikumu Nr. 621 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna īstenošanas un uzraudzības kārtība” 17. punktā noteikto.

<sup>58</sup> Datus vispār nav ievadījušas Iekšlietu ministrija, Izglītības un zinātnes ministrija, Tieslietu ministrija, Valsts kanceleja, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija. Pārējo iestāžu atbildībā ievadītajos datos nepieciešami precizējumi, papildinājumi.

ziņojumā), t. sk. rīcības variantus, priekšnosacījumus, pasākumus šķēršļu novēršanai un konkrētu priekšlikumu rīcībai, kas nodrošina saistību izpildi Atvēršanas fonda finansējuma saņemšanai no EK.


Līdz 2022. gada 14. jūlijam par AF ieviešanu atbildīgās ministrijas/iestādes turpina darbu pie 49 normatīvo regulējumu izstrādes AF investīciju īstenošanai. **MK ir apstiprināti jau 18 MK noteikumi/informatīvie ziņojumi par kopējo AF finansējumu 665,72 milj. euro**, t. sk. **veselības jomā** par 152,1 milj. euro (GoLatvia projekts, veselības infrastruktūra, integrēta veselības aprūpes sistēma), **likuma varas jomā** 8,02 milj. euro (nodokļu administrēšanas un muitas jomas stiprināšana, publiskās pārvaldes modernizācija, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana un ekonomisko noziegumu izmeklēšana), **nevienlīdzības mazināšanas jomā** par 115,2 milj. euro (prognozēšanas rīks, sociālā rehabilitācija, sociālās aprūpes pakalpojumi, īres mājokļu būvniecība), **klimata pārmaiņu un ilgtspējas jomā** par 174,4 milj. euro (energoefektivitāte uzņēmējdarbībai, glābšanas dienestu kapacitātes stiprināšana, daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte), **produktivitātes jomā** par 25 milj. euro (kompetences centri) un **digitālās transformācijas jomā** par 191 milj. euro (finanšu instrumenti, valsts pārvaldes un pašvaldību digitalizācija, digitālās prasmes)<sup>59</sup>.

Saskaņā ar Valsts kases datiem 2022. gada septiņos mēnešos AF projektu un pasākumu īstenošanai no valsts budžeta ir iztērēti 1,5 milj. euro. 2022. gada jūlijā atbilstoši nozaru ministriju un Valsts kancelejas sniegtajai informācijai **aktualizēta AF investīciju prognoze** (prognozi skatīt attēlā Nr. 14)<sup>60</sup>. Salīdzinot ar sākotnējo AF plānu, **izdevumu līmenis** visvairāk **samazinājies 2022. gadā** – par 144 milj. euro (lielākoties VARAM, EM, SM un VM pārraudzītajos pasākumos). Visbūtiskākie samazinājumi 2022. gadā tādās komponentēs kā “Ekonomiskā transformācija un produktivitāte” (mīnus 93 %), “Nevienlīdzības mazināšana” (mīnus 82 %) un “Veselība” (mīnus 69 %). Lai nodrošinātu aktuālu un iespējami precīzu valsts budžeta izdevumu prognožu informāciju budžeta likuma un stabilitātes programmas sagatavošanas vajadzībām, FM turpinās regulāru sadarbību ar nozares ministrijām un Valsts kanceleju, aktualizējot AF ieviešanas finanšu plūsmu.

<sup>59</sup> Detalizēta informācija ir pieejama ES fondu tīmekļa vietnes sadaļā → Eiropas Atvēršanas fonds → [Plānotās projektu atlases \(esfondi.lv\)](#), kā arī FM ziņojumā par ES fondu investīciju aktualitātēm 2022. gada aprīlī – maijā: [https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin\\_200522\\_ikmen\\_esif.pdf](https://www.esfondi.lv/upload/Zinojumi/fmzin_200522_ikmen_esif.pdf).


<sup>60</sup> Prognoze pieejama ES fondu mājas lapā: <https://www.esfondi.lv/finansejuma-apjoms>.  
FMzin\_200722\_ESIF

Attēls Nr. 14 "AF budžeta izdevumu indikatīvā prognoze, AF finansējums, milj. euro"

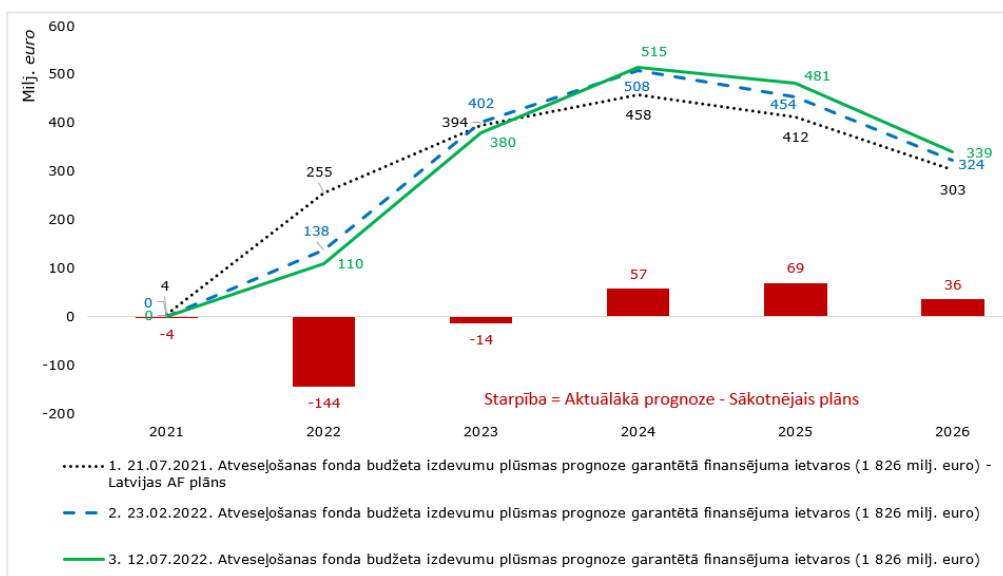

Ņemot vērā, ka iestādes šobrīd norāda uz iespējamiem 2022. gada atskaites punktu un mērķu izpildes kavējumiem, FM aktualizēja indikatīvo AF ieņēmumu plūsmu. Atšķirībā no ES fondu sistēmas AF ieņēmumiem nav tiešas korelācijas ar izdevumiem – saņemami noteikti apjomi par atskaites punktu un mērķu izpildi. Jāizpilda pilnīgi visi konkrētā gadā sasniedzamie atskaites punkti un mērķi, lai varētu iesniegt maksājuma pieprasījumu EK. Tādējādi vēlāk par 2023. gada 2. ceturksni iesniegts maksājuma pieprasījums par 2022. gada atskaites punktu un mērķu sasniegšanu rada tiešu negatīvu ietekmi uz budžeta ieņēmumiem 2023. gadā, t. i., tos būtu iespējams saņemt vien 2024. gadā.

Attēls Nr. 15 "AF budžeta ieņēmumu indikatīvā prognoze, AF finansējums, milj. euro"

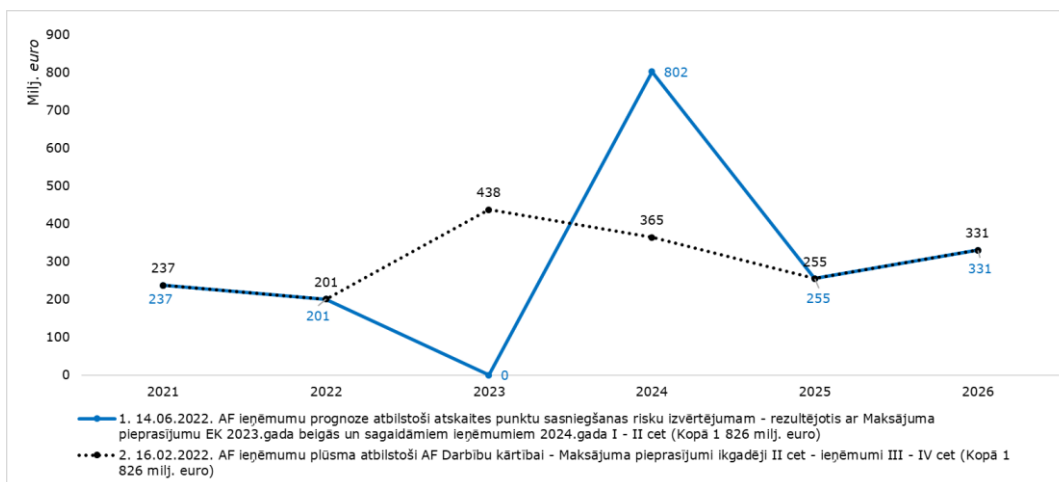


## 5. EEZ/Norvēģijas grantu investīciju progress<sup>61</sup>

Līdz 2024. gada beigām Latvijā ir iespēja investēt 99,7 milj. *euro*, t. sk. **85,4 milj. *euro***<sup>62</sup> EEZ/Norvēģijas grantus un 14,3 milj. *euro* valsts budžeta līdzfinansējumu. Līdz 2022. gada vidum 21,8 milj. *euro* ir priekšfinansēti investīciju uzsākšanas darbībām no valsts budžeta, t. sk. 18,6 milj. *euro* jeb 85 % grants. Skatīt attēlu Nr. 16.


*Attēls Nr. 16 “Investīciju kopējais progress līdz 2022. gada jūlijam, EEZ/Norvēģijas granti, milj. *euro*”*

“+” t. sk. sasniegtais progress periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz augustam

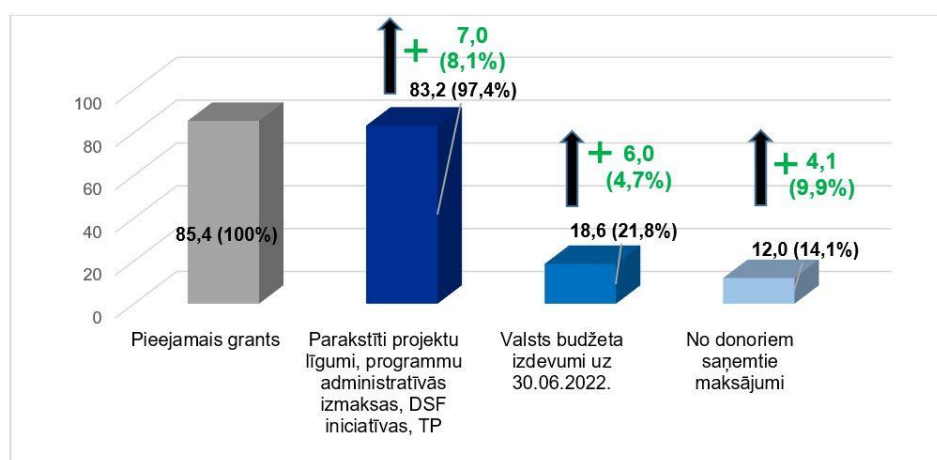

Analizējot 2022. gada aprīlī programmu apsaimniekotāju sniegto informāciju, **lielākā finanšu plūsmas intensitāte paredzama 2023. un 2024. gadā**. Skatīt attēlā Nr. 17. un Nr. 18, kā arī par programmu konkursos sasniegto progresu – tabulā Nr. 1. Attiecīgi īpaši svarīga ir proaktīva risku vadība, lai programmu apsaimniekotāji sekmīgi sasniegtu investīciju mērķus un rezultātus līdz 2024. gada 30. aprīlim.

*Attēls Nr. 17 “Investīciju plūsmas indikatīvais plāns 2022.–2025. gadam, EEZ/Norvēģijas granti, milj. *euro*”<sup>63</sup>*

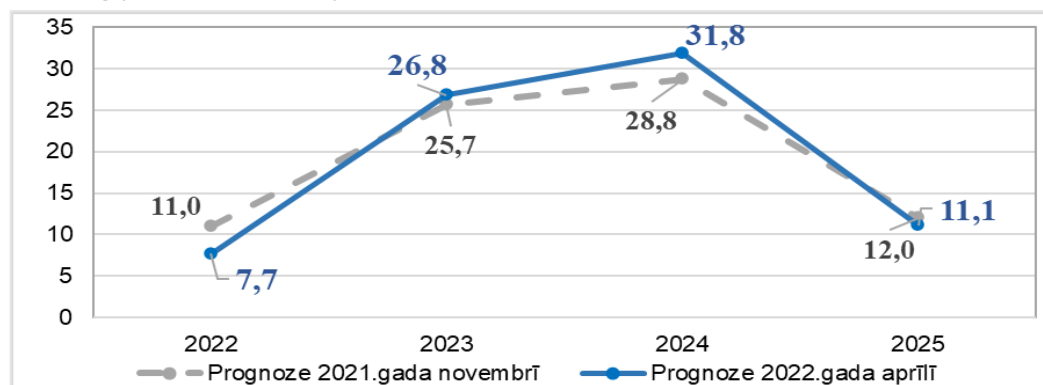


<sup>61</sup> Plašāka informācija pieejama EEZ/Norvēģijas grantu portālā: <https://eeagrants.lv/par-grantiem/par-grantiem/>.

<sup>62</sup> 81,3 milj. *euro* paredzēti sešām nozaru investīciju programmām, 2,6 milj. *euro* ( 3,0 %) Divpusējās sadarbības fondam un 1,5 milj. *euro* (1,8 %) investīciju vadībai un kontrolei, galvenokārt, VI, RI un IUB.

<sup>63</sup> Pamatojoties uz programmu apsaimniekotāju aktualizēto un 2021. gada 20. novembrī Finanšu instrumenta birojam iesniegto informāciju par 2021.–2025. gadā plānoto atmaksu saņemšanu no donorvalstīm.

Attēls Nr. 18 "Programmu investīciju progress līdz 2022. gada jūlijam, EEZ/Norvēģijas granti, milj. euro"

"+" t. sk. progress periodā no 2022. gada sākuma līdz jūlijam

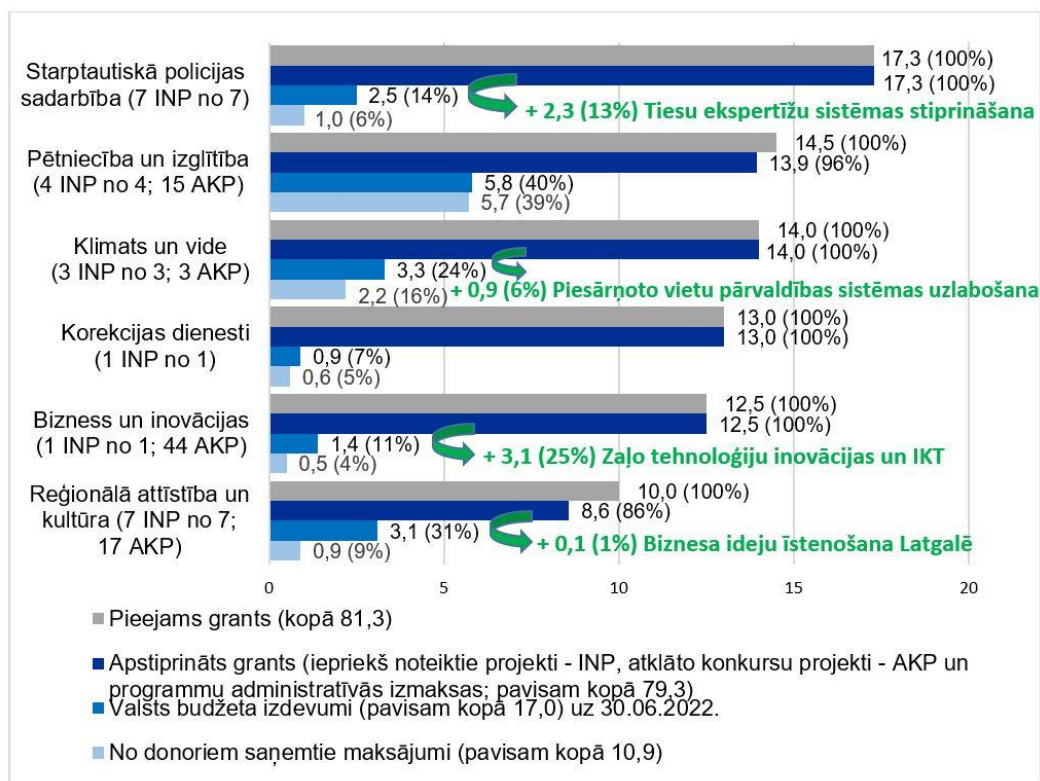

Tabula Nr. 1 "Programmu investīciju konkursu rezultāti līdz 2022. gada augustam, EEZ/Norvēģijas granti 85 % un valsts budžets 15 %, milj. euro"

Programma/ Konkursa nosaukums	Izsludināšanas laiks <sup>64</sup>	Saņemto/ apstiprināto iesniegumu skaits	Pieejamās investīcijas milj. euro	Pieprasītās investīcijas, milj. euro	Pieprasījums pārsniedz pieejamās investīcijas
<b>Pētniecība un izglītība</b>					
1. Baltijas pētniecība programma	19.08.-19.10.2020.	81/ 9	8,5	75,9	9 reizes
2. Pētniecība un izglītība/ Stipendijas 1. konkurss	10.02.-19.04.2021.	5/ 4	0,3	0,2	0
3. Pētniecība un izglītība/ Stipendijas 2. konkurss	15.02.-19.04.2022	2/-	0,3	0,03	0
<b>Klimats un vide</b>					
4. Ar vēsturiski piesārņotajām teritorijām saistīto risku samazināšana	05.06.-07.12.2020.	5/ 3	11,0	17,9	1,6 reizes

<sup>64</sup> Atbilstošo EEZ/Norvēģijas grantu vadības likumam projektu vērtēšana noslēdzas vēlākais 4 mēnešu laikā pēc projektu iesniegumu iesniegšanas beigu datuma.

Programma/ Konkursa nosaukums	Izsludināšanas laiks <sup>64</sup>	Saņemto/ apstiprināto iesniegumu skaits	Pieejamās investīcijas milj. <i>euro</i>	Pieprasītās investīcijas, milj. <i>euro</i>	Pieprasījums pārsniedz pieejamās investīcijas
<b>Pētniecība un izglītība</b>					
<b>Uzņēmējdarbības attīstība, inovācijas un MVU</b>					
5. Atbalsts <b>zaļo inovāciju (ZI) un IT risinājumu ieviešanā jaunu produktu ražošanā</b>	14.04.-30.06.2021.	ZI 45/ 15	6,4	20	3,1 reizes
		Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) 15/ 6	2,2	5,8	2,6 reizes
6. <b>ZI un IKT</b> produktu izstrāde	07.06.-31.08.2021.	ZI 16/ 7	0,8	1,6	2 reizes
		IKT 18/ 7	0,9	2	2,2 reizes
7. Dzīves <b>kvalitāti atbalstošu tehnoloģiju</b> izstrāde	01.07.-30.09.2021.	22/ 9	1,2	2,7	2,3 reizes
<b>Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība</b>					
8. Atbalsts profesionālās <b>mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai</b> 1.kārta	31.03.-02.07.2021.	29/ 9	1,9	2,6	3,3 reizes
9. Atbalsts profesionālās <b>mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai</b> 2.kārta	04.01.-07.03.2022.	31/-	1,3	6,5	5 reizes
10. Atbalsts <b>biznesa ideju</b> īstenošanai <b>Latgalē</b> 1.kārta	17.06.-21.09.2021.	16/910	0,5	0,1	0
10. Atbalsts <b>biznesa ideju</b> īstenošanai <b>Latgalē</b> 2.kārta <sup>65</sup>	01.04.-01.06.2022	17/-	0,4	0,2	0

**DSF** no līdz šim MK apstiprinātajām 14 iniciatīvām<sup>66</sup> (1,4 milj. *euro*) 5 iniciatīvas uzsāktas 2022. gadā (0,41 milj. *euro*), viena ir pabeigta<sup>67</sup>, turpinās 8 iniciatīvu īstenošana par gandrīz 1 milj. *euro*. Vienlaikus visās programmās īstenojas divpusējās sadarbības pasākumi kopā par 0,9 milj. *euro*.

<sup>65</sup> Konkursā iesniegti projekti tikai par aptuveni 30 % no pieejamā finansējuma. VARAM sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu strādā pie konkursa trešās kārtas izsludināšanai 2022. gada augustā, t. sk. izmaiņām nosacījumos, lai nodrošinātu finansējuma sekmīgu un pilnīgu investēšanu.

<sup>66</sup> 2020./2021. gadā plānotie publiskie pasākumi, pieredzes apmaiņas vizītes un semināri ir pārsvarā pārcelti uz 2022. gadu Covid-19 ierobežojumu dēļ vai arī to vietā pēc iespējas tiek organizēti pasākumi tiešsaistē.

<sup>67</sup> Latvijas Ārpolitikas institūta īstenota iniciatīva "[Norvēģijas un Baltijas pētniecības tīkls. Kritiskā infrastruktūra: institucionālā koordinācija un politikas prioritātes](#)". Provizoriskā izdevumu summa – 171 452 *euro*. Galvenais ieguvums – izdota grāmata par veikto pētījumu "Kritiskā infrastruktūra Baltijas valstīs un Norvēģijā: aizsardzības un komunikācijas stratēģijas un prakse" sadarbojoties ar Baltijas valstu un Norvēģijas pētniekiem, tādējādi stiprinot arī sadarbību pētniecībā starp minētajām valstīm.

Saskaņā ar 2022. gada 10. maijā MK lemto<sup>68</sup>, EEZ/Norvēģijas finansējumu indikatīvi 387 tūkst. *euro* plānots izmantot ukraiņu bēgļu atbalstam Latvijā – fonds “Ziedot.lv” sniegs palīdzību Ukrainas bēgļiem Latvijā kopā par 150 tūkst. *euro*<sup>69</sup> un tiek izskatītas iespējas par indikatīvi 237 tūkst. *euro* atbalstīt citas iniciatīvas ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai. No DSF konsultatīvās darba grupas pārstāvjiem saņemti četri priekšlikumi par kopējo summu 0,59 milj. *euro*. FM virzīs ar Iekšlietu ministriju saskaņotus no ukraiņu bēgļu atbalsta prioritāšu viedokļa iniciatīvu priekšlikumus gala lēmuma pieņemšanai DSF Komitejā, ievērojot DSF finansējuma atlikumu – 0,23 milj. *euro*.

2022. gada jūlijā DSF Konsultatīvajā darba grupā<sup>70</sup> ir konceptuāli saskaņota un DSF Komitejā apstiprināta ar nosacījumu par attiecīga MK lēmuma pieņemšanu **jauna iniciatīva** - Norvēģijas vēstniecības Rīgā pieteikta stratēģiskā iniciatīva<sup>71</sup> “**Vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšana Latvijā un Norvēģijā “Sens nams, jauns stāsts”**” par 53,4 tūkst. *euro* 100 % donorvalstu finansējumu, ko īstenotu biedrība “Kultūras projektu koordinācijas centrs” sadarbībā ar Norvēģijas partneri (Akershus ēku konservācijas centrs) indikatīvi no 2023. gada janvāra līdz 2024. gada aprīlim. Iniciatīvas mērķis ir sekmēt Kuldīgas un Drōbak (Norvēģija) sadarbības nepārtrauktību un ilgtspēju kultūras mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas (restaurācijas) jomā, paplašinot labās prakses un pieredzes apmaiņas izplatīšanas mērogu plašākā Latvijas teritorijā. Attiecīgi tiek rosināts MK atbalstīt EEZ/Norvēģijas grantu DSF iniciatīvas priekšlikumu par 53 390 *euro* (100 % donorvalstu finansējums).

## 6. Secinājumi un priekšlikumi

Ņemot vērā šajā ziņojumā minēto, ierosinām **MK protokollēmumā noteikt šādus uzdevumus:**

1. Lai **nodrošinātu nepieciešamo papildu finansējumu pārtikas un pamata materiālās palīdzības nodrošināšanai** LM administrētās EAFVP programmas ietvaros:

<sup>68</sup> Atbilstoši 10.05.2022. MK sēdes protokollēmuma Nr. 26 47. § 3. punktam nolemts DSF atlikumu (indikatīvi 237 382 *euro* uz 2022. gada 30. aprīli) novirzīt iniciatīvām jomā “*Mērķtiecīgs atbalsts saistībā ar Eiropas bēgļu krīzes risināšanu Latvijā, tostarp ukraiņu bēgļu vajadzību risināšanai Latvijā*” ar 100 % donorvalstu finansējumu, balstoties uz DSF Konsultatīvās darba grupas viedokli, t. sk. prioritāri Iekšlietu ministrijas vērtējumu par primāri nepieciešamo atbalstu vajadzību apmierināšanai Ukrainas bēgļiem Latvijā.

<sup>69</sup> Preses relīze par piešķirto finansējumu fondam “Ziedot.lv” pieejama FM tīmekļa vietnē: <https://www.fm.gov.lv/lv/jaunums/ziedotlv-paplasina-palidzibu-ukrainas-begliem-latvija>. EEZ/Norvēģijas grantu tīmekļa vietnē pieejams plašāks apraksts par fonda “Ziedot.lv” plānoto atbalstu bēgļiem no Ukrainas:

[https://eeagrants.lv/wp-content/uploads/2022/06/Ziedot.lv\\_lv\\_pieteikums\\_eea\\_norway\\_grantam\\_lv\\_270622.pdf](https://eeagrants.lv/wp-content/uploads/2022/06/Ziedot.lv_lv_pieteikums_eea_norway_grantam_lv_270622.pdf)

<sup>70</sup> Lai nacionālā līmenī nodrošinātu DSF iniciatīvu pārskatāmu un pareizas finanšu pārvaldības principiem atbilstošu apspriešanu ar sociāliem un sadarbības partneriem pirms to iesniegšanas MK un secīgi gala lēmumam Divpusējās sadarbības fonda komitejā, VI saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 683 2018. gada 27. novembrī izveidoja DSF Konsultatīvo darba grupu, kuras sastāvā ir pārstāvji no VI, Valsts kancelejas, visām nozaru ministrijām, t. sk., programmu apsaimniekotājiem, sociāliem un sadarbības partneriem (lielākās darba devēju, darba ņēmēju, komersantu un pašvaldības pārstāvošās nevalstiskās organizācijas).

<sup>71</sup> Apstiprinātās un pieteiktās DSF fonda stratēģiskās iniciatīvas pieejamas grantu portālā:

<https://eeagrants.lv/divpusejas-sadarbibas-fonds/apstiprinatie-projekti/>.

- 1) FM sadarbībā ar atbildīgajām iestādēm sagatavot un virzīt apstiprināšanai grozījumus DP, paredzot **DP projektiem nepiesaistītu finansējumu 10 465 225 euro pārdalīt uz EAFVP programmu;**
- 2) vienlaikus LM virzīt apstiprināšanai atbilstošu EAFVP programmas grozījumu priekšlikumu.

2. **LM un SM iespējami ātri nodrošināt kavēto 2021.–2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildi.**

3. **ES fondu atbildīgajām iestādēm nodrošināt ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda investīciju ieviešanas nosacījumu izstrādi un virzību apstiprināšanai MK atbilstoši šī ziņojuma pielikumā noteiktajam indikatīvajam laika grafikam.**

4. **Atbalstīt EEZ/Norvēģijas grantu Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu vēsturisko ēku saglabāšanas pieredzes veicināšanai Latvijā un Norvēģijā par 53 390 euro ar 100 % donoralvalstu finansējumu.**

5. NVA projektā “Paaugstināt valsts ēkas Miera ielā 3, Siguldā, energoefektivitāti”, **neatbilstoši veiktos izdevumus 4 907,10 euro (ES fondu līdzfinansējums 4 171,03 euro, valsts budžeta finansējums 736,07 euro) attiecināt uz ES fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda valsts budžeta virssaistībām.**

6. **Atzīt par izpildītiem MK 2019. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 29, 11. § 2.1. apakšpunkts), 2018. gada 27. martā (prot. Nr. 17, 19. § 2.2. apakšpunkts) un 2019. gada 26. novembrī (prot. Nr. 55, 13. § 2.1. apakšpunkts) MK uzdevumus IZM un FM rast risinājumu 2007.–2013. gada plānošanas perioda aktivitāšu projektu pēcuzraudzībai<sup>72</sup> nepieciešamā papildu finansējuma nodrošināšanai, izstrādājot ES fondu 2021.–2027. gadam ieviešanas nosacījumus vai gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta un vidēja termiņa budžeta ietvara likumprojekta sagatavošanas un izskatīšanas procesā un par rasto risinājumu informēt MK. Minētie uzdevumi ir izpildīti, jo MK 2022. gada 11. janvārī atbalstītais FM informatīvais ziņojums par Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam ieviešanai nepieciešamajiem resursiem<sup>73</sup> paredz iespēju no ES fondu tehniskās palīdzības līdzekļiem segt nepieciešamās izmaksas 2007.–2013. gada plānošanas perioda pēcuzraudzības nodrošināšanai<sup>74</sup>. Līdz ar to IZM nodrošinās minēto**

<sup>72</sup> ES fondu 2007.–2013. gada plānošanas perioda projektu ikgadējā uzraudzība attiecībā par papildinošās saimnieciskās darbības un ierobežotas jomas darbības rezultātiem turpinās 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes "Zinātnes infrastruktūras attīstība" 1. kārtas (līdz 2032. gadam), 3.1.1.1. aktivitātes "Mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana profesionālās izglītības programmu īstenošanai" (līdz 2027. gadam) un 3.1.2.1.1. apakšaktivitātes "Augstākās izglītības iestāžu telpu un iekārtu modernizēšana studiju programmu kvalitātes uzlabošanai, tajā skaitā nodrošinot izglītības programmu apgūšanas iespējas arī personām ar funkcionāliem traucējumiem" (līdz 2024. gadam) projektiem. Uzraudzību līdz 2021. gadam nodrošināja Valsts izglītības attīstības aģentūra kā sadarbības iestāde, savukārt saskaņā ar aktivitāšu īstenošanas nosacījumiem uzraudzību pēc 2020. gada 31. decembra nodrošina IZM.

<sup>73</sup> MK 2022. gada 11. janvāra sēdes protokols Nr.2, 50. § [https://tapportals.mk.gov.lv/legal\\_acts/e8316aa1-3eeb-4e80-98b8-abfd6d986b4f](https://tapportals.mk.gov.lv/legal_acts/e8316aa1-3eeb-4e80-98b8-abfd6d986b4f)

<sup>74</sup> Skatīt arī 2021.–2027. gada plānošanas perioda tehniskās palīdzības īstenošanas nosacījumu - [MK 14.06.2022 noteikumu Nr.343](#) 8.7. apakšpunktu.

pēcuzraudzību tai piešķirto tehniskās palīdzības 2021.–2027. gadam līdzekļu ietvaros.

Ministrs

J. Reirs

Ševčenko 26117031  
[Svetlana.Sevcenko@fm.gov.lv](mailto:Svetlana.Sevcenko@fm.gov.lv)
